


日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年11月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)		11月1日(土) 12時30分～13時		11月2日(日) 10時30分～11時		11月3日(月) 12時30分～13時		11月6日(木) 12時30分～13時		11月7日(金) 12時30分～13時	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	69.5	68.5	69.3	80.2	67.0				
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	68.2	66.9	66.9	95.5	81.8				
		(L) 原子力	320.7	320.8	320.9	321.3	321.2				
		(J) 一般水力	25.2	24.1	25.5	24.0	24.1				
		(K) 地熱	14.4	14.3	14.3	14.3	14.5				
		(H) バイオマス専焼電源	31.4	31.4	31.4	32.8	37.8				
		(I) 地域資源バイオマス	29.0	29.4	28.8	27.9	26.1				
		(E-1) 太陽光	624.5	587.9	647.5	671.3	691.5				
		(E-2) 風力	44.2	36.3	35.1	32.4	7.5				
		(E-2) 想定誤差量	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0				
		エリア供給力 計①	1,310.1	1,262.6	1,322.7	1,382.7	1,354.5				
	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	785.0	739.1	775.0	885.0	845.0				
		(C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0				
		(C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9				
		(B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 167.9	▲ 130.0	▲ 165.9	▲ 175.9	▲ 163.5				
		(B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整①②⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
		エリア需要等 計⑦=②-(③+④+⑤+⑥)	1,157.8	1,074.0	1,145.8	1,265.8	1,213.4				
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
必要性 (万kW)		エリア供給力 計①	1,310.1	1,262.6	1,322.7	1,382.7	1,354.5				
エリア需要等 計⑦		1,157.8	1,074.0	1,145.8	1,265.8	1,213.4					
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		152.3	188.6	176.9	116.9	141.1					

○需給状況イメージ図

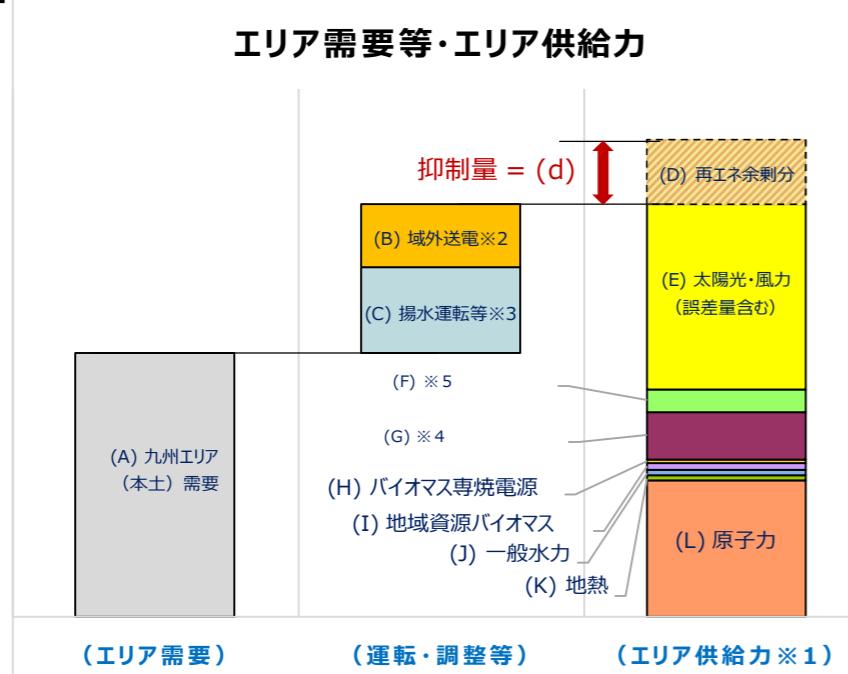

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

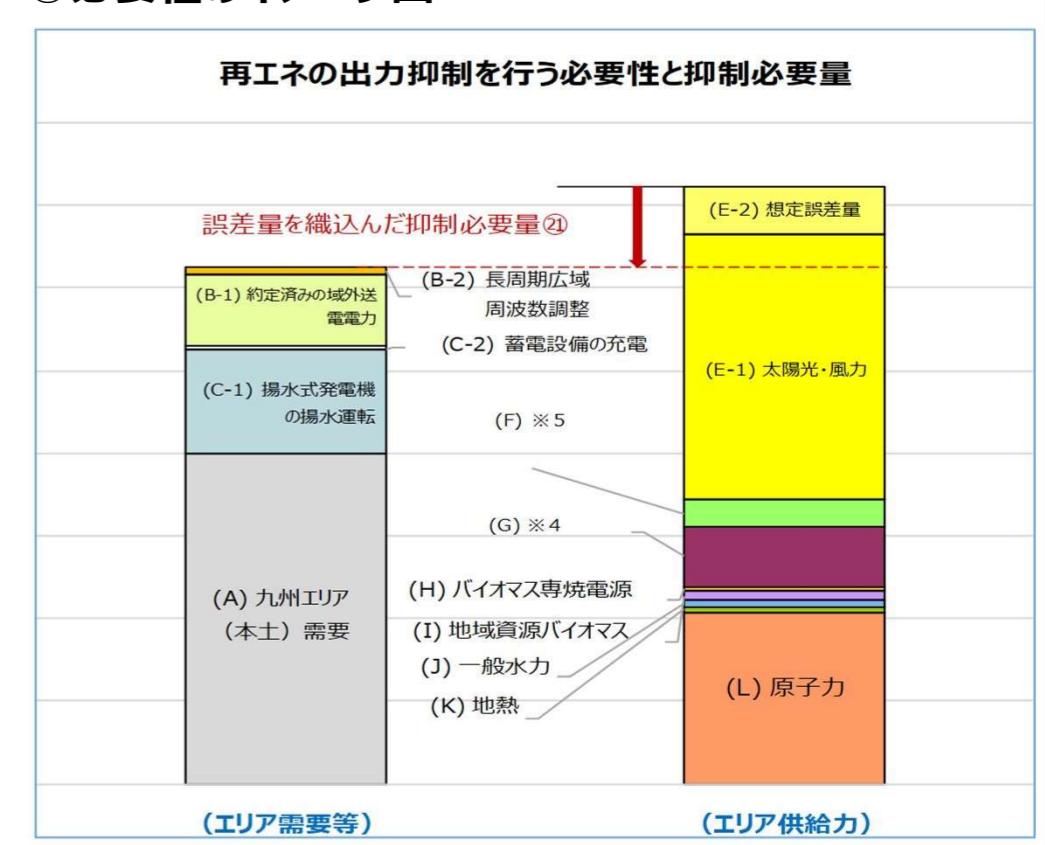

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年11月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)		11月8日(土) 12時30分～13時		11月10日(月) 12時30分～13時		11月14日(金) 12時30分～13時		11月15日(土) 12時～12時30分		11月16日(日) 12時～12時30分	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	59.7	78.8	89.3	74.3	72.4				
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	66.3	84.2	88.9	71.2	81.3				
		(L) 原子力	321.1	321.6	322.0	322.0	322.0				
		(J) 一般水力	23.5	23.6	23.4	27.3	26.8				
		(K) 地熱	14.5	13.9	14.3	14.3	14.2				
		(H) バイオマス専焼電源	32.6	32.8	28.0	27.7	27.7				
		(I) 地域資源バイオマス	25.9	24.6	26.7	26.5	26.4				
		(E-1) 太陽光	636.2	661.3	712.6	733.5	705.0				
		(E-2) 風力	19.9	34.6	17.2	5.1	0.2				
		想定誤差量	83.0	83.0	83.0	83.0	13.0				
		エリア供給力 計①	1,282.7	1,358.4	1,405.4	1,384.9	1,289.0				
	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	775.0	815.0	855.0	779.0	705.0				
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0				
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5				
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 153.5	▲ 163.5	▲ 175.9	▲ 166.9	▲ 177.6				
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整①②⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,133.4	1,181.0	1,233.4	1,148.5	1,085.1				
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
必要性 (万kW)	エリア供給力 計①		1,282.7	1,358.4	1,405.4	1,384.9	1,289.0				
エリア需要等 計⑦		1,133.4	1,181.0	1,233.4	1,148.5	1,085.1					
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		149.3	177.4	172.0	236.4	203.9					

○需給状況イメージ図

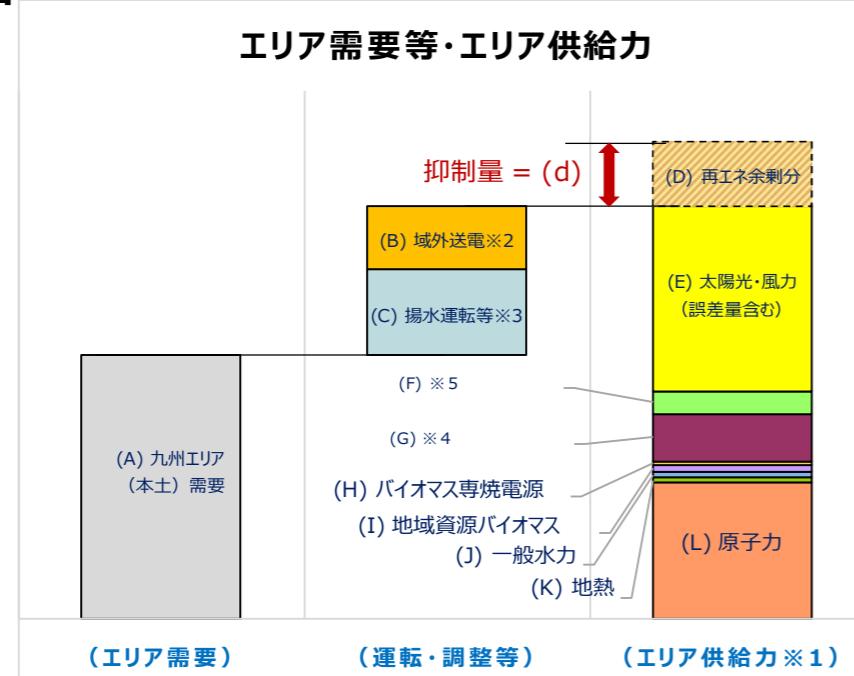

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

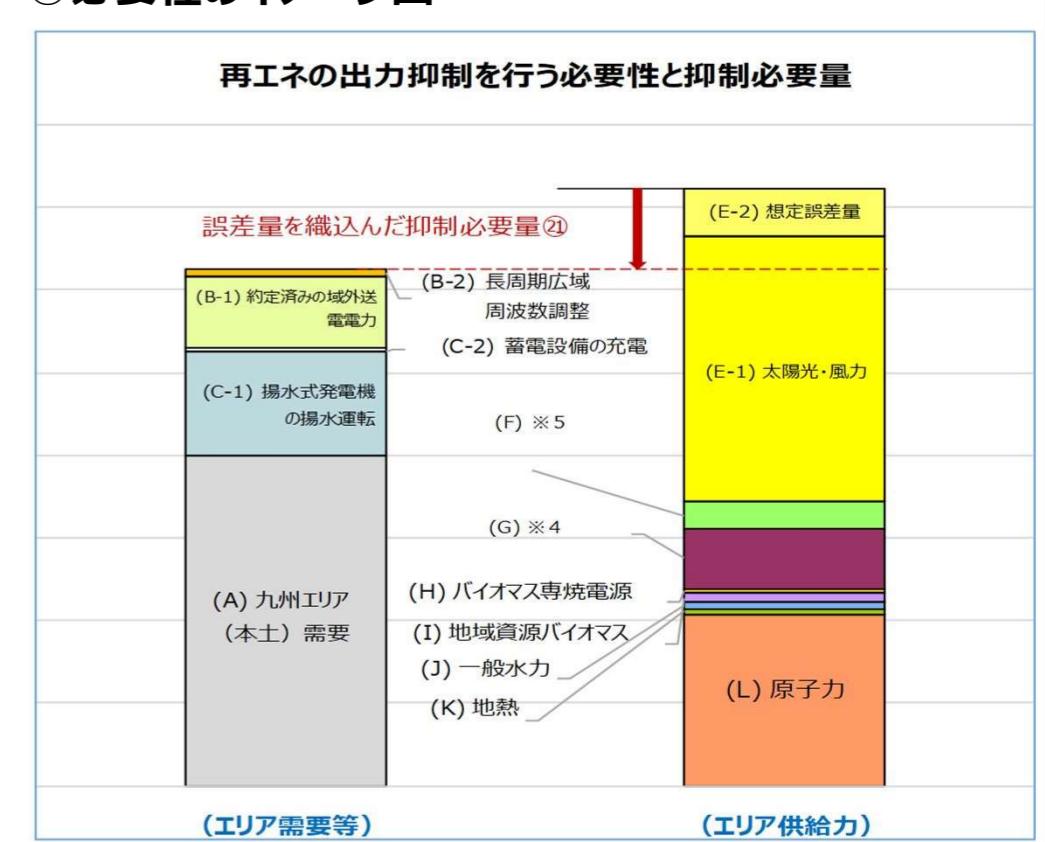

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年11月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)		11月21日(金) 12時~12時30分		11月22日(土) 12時~12時30分		11月23日(日) 12時~12時30分		11月26日(水) 12時30分~13時		11月28日(金) 12時~12時30分	
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	93.0	94.9	73.6	92.4	97.4				
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	137.6	72.1	71.1	116.7	136.4				
		(L) 原子力	322.2	322.2	322.5	322.4	322.6				
		(J) 一般水力	23.3	23.5	23.8	23.3	22.6				
		(K) 地熱	14.3	14.2	14.2	14.2	13.9				
		(H) バイオマス専焼電源	33.9	29.1	28.1	37.5	35.0				
		(I) 地域資源バイオマス	25.2	25.9	25.8	26.2	26.2				
		(E-1) 太陽光	636.8	772.2	778.0	581.7	693.5				
		風力	32.7	4.2	1.9	12.0	32.0				
		(E-2) 想定誤差量	125.0	10.8	10.0	125.0	110.5				
エリア供給力 計①		1,444.0	1,369.1	1,349.0	1,351.4	1,490.1	989.4				
エリア 需要等	エリヤ 需要等	(A) エリヤ需要 (本土) ②	951.0	814.1	765.0	895.0	91.1				
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 91.1	▲ 91.1				
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.5				
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 148.1	▲ 188.2	▲ 167.9	▲ 204.7	▲ 234.0				
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整①②⑥	0.0	0.0	0.0	▲ 3.6	0.0				
エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)		1,328.6	1,231.8	1,162.4	1,196.9	1,317.0					
必要性 (万kW)	エリア供給力 計①		1,444.0	1,369.1	1,349.0	1,351.4	1,490.1				
	エリア需要等 計⑦		1,328.6	1,231.8	1,162.4	1,196.9	1,317.0				
	(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		115.4	137.3	186.6	154.5	173.1				

○需給状況イメージ図

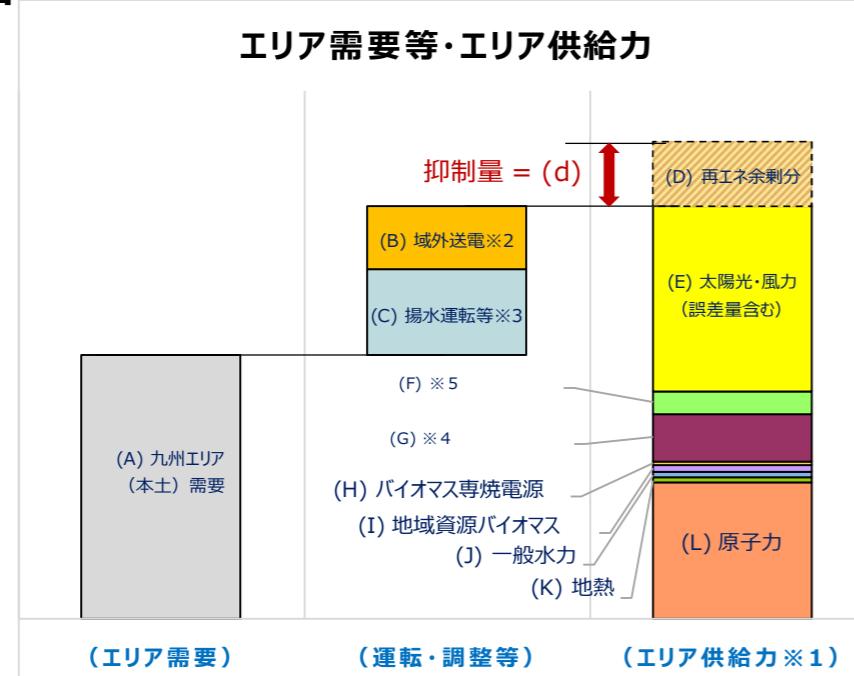

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリヤ供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線(関門連系線)の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

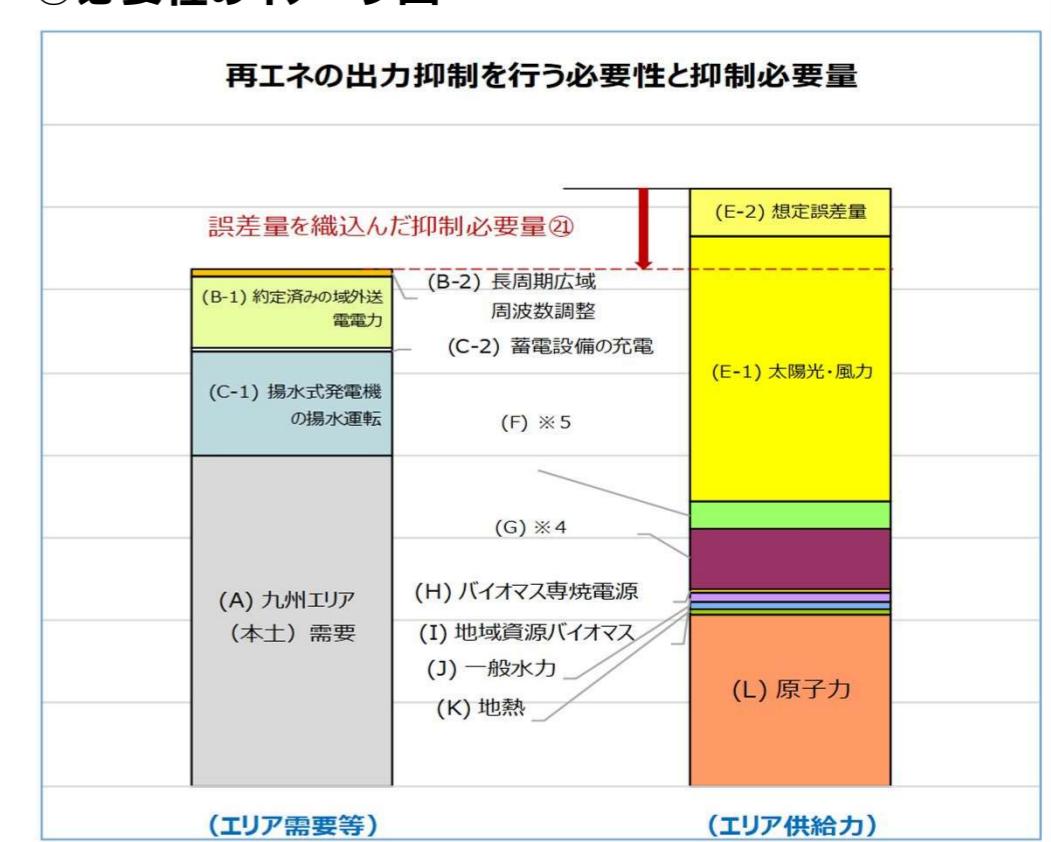

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年11月)


場所		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)		11月29日(土) 12時30分～13時	11月30日(日) 12時～12時30分	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	93.5	93.1	
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	72.1	71.5	
		(L) 原子力	322.4	322.6	
		(J) 一般水力	22.0	22.4	
		(K) 地熱	16.1	16.0	
		(H) バイオマス専焼電源	33.6	33.4	
		(I) 地域資源バイオマス	28.3	28.2	
		(E-1) 太陽光	765.9	724.0	
		(E-2) 風力	0.8	13.0	
		想定誤差量	10.0	13.0	
エリア供給力 計①		1,364.7	1,337.2		
エリア 需要等	エリヤ 需要等	(A) エリヤ需要 (本土) ②	795.0	775.0	
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 91.1	▲ 91.1	
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 2.5	▲ 4.2	
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 180.5	▲ 184.1	
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整①②⑥	0.0	0.0	
エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)		1,069.1	1,054.4		
必要性 (万kW)	【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
	エリア供給力 計①		1,364.7	1,337.2	
	エリア需要等 計⑦		1,069.1	1,054.4	
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		295.6	282.8		

○需給状況イメージ図

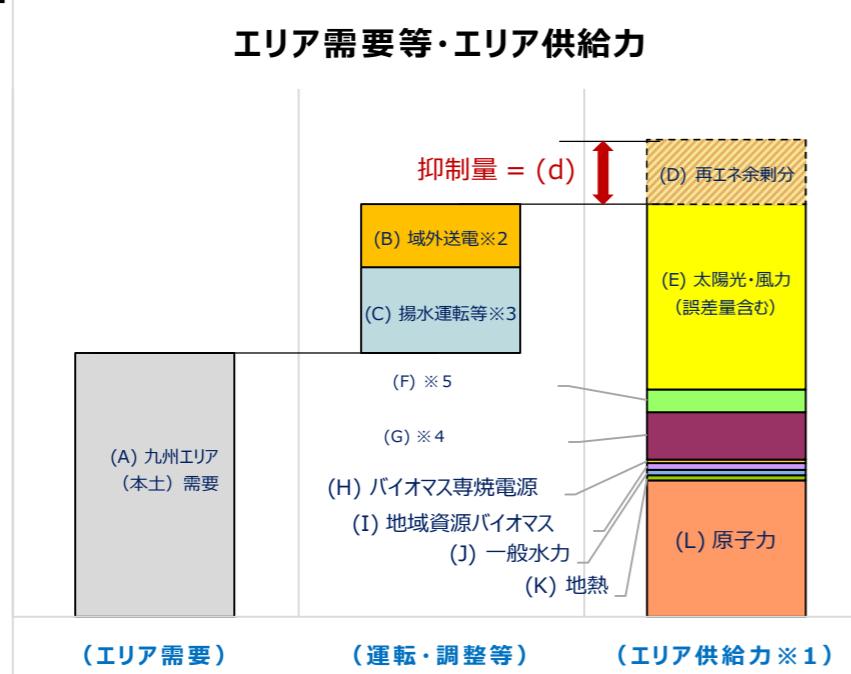

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線(関門連系線)の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

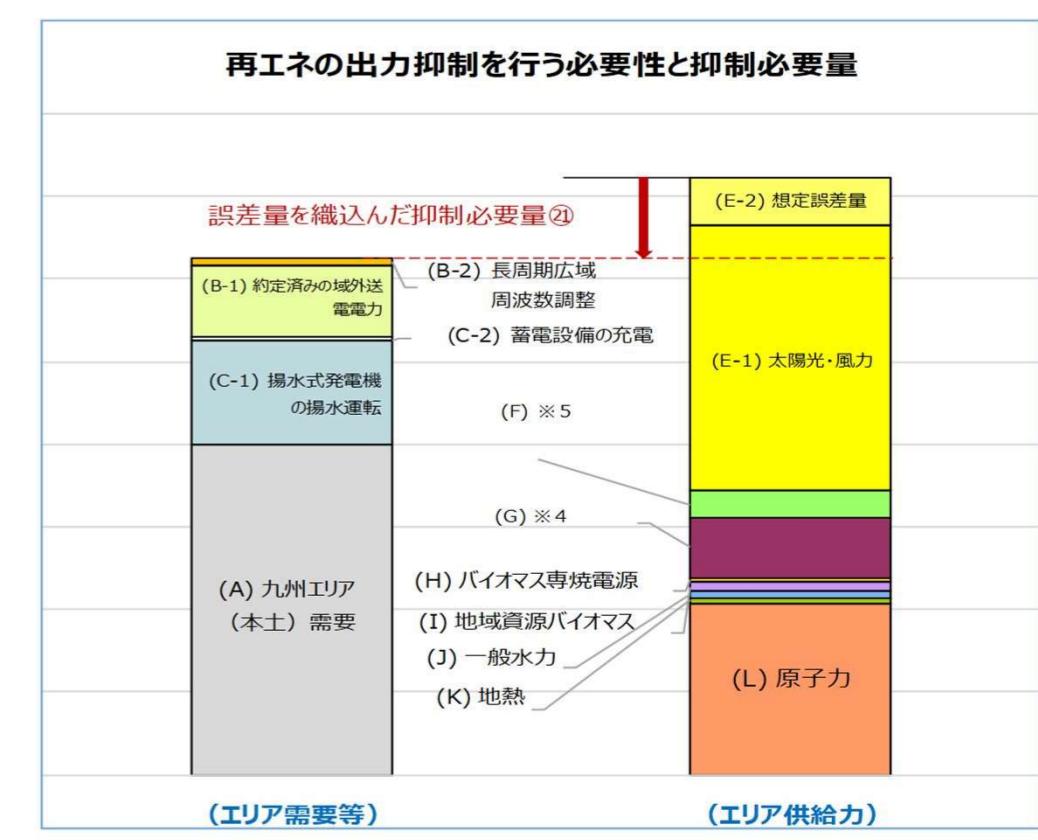

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年11月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)				11月7日(金)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		0.0	0.0	0.0	
		菅北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		17.5	17.5	0.0		17.5	17.5	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		新大分(コンバインド)	34.0	48.3	14.3	(c)	33.1	47.3	14.3	(c)	33.8	48.1	14.3	(c)	36.0	50.3	14.3	(c)	35.2	49.5	14.3	(c)
	合計		55.2	69.5	14.3	—	54.3	68.5	14.3	—	55.0	69.3	14.3	—	65.9	80.2	14.3	—	52.7	67.0	14.3	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)				11月7日(金)				
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	合計		▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)				11月7日(金)				
電力貯蔵装置の充電	電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
			▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)				11月7日(金)				
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
		A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0													
	電制電源	B	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0													
		火力他	15.1 [17%]	13.2 [15%]	▲ 1.9	(b)	14.1 [16%]	12.2 [14%]	▲ 1.9	(b)	14.0 [16%]	12.1 [13%]	▲ 1.9	(b)	14.3 [16%]	40.7 [45%]	26.4	(b)	14.4 [16%]	27.1 [30%]	12.7	(b)
		電制電源を除く	(43.6) [24%]				(43.6) [24%]															
		自家発余剰	10.0	0.6	▲ 9.4	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.3	▲ 9.6	(d)
	合計		79.5	68.2	▲ 11.3		78.5	66.9	▲ 11.6		78.4	66.9	▲ 11.5		78.7	95.5	16.8		78.8	81.8	3.1	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)				11月7日(金)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		※1 空容量 = (運用容量) - 約定済み域送電能力 - 三次調整力①②	0.0 (167.9)	0.0	0.0		36.9 (166.9)	0.0	▲ 36.9	(a)	0.0 (165.9)	0.0	0.0		0.0 (175.9)	0.0	0.0		0.0 (163.5)	0.0	0.0	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		11月1日(土)				11月2日(日)				11月3日(月)				11月6日(木)								

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年11月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	石炭	松浦	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0	
	石炭	芦北	17.5	17.5	0.0		17.5	17.5	0.0		17.5	17.5	0.0		8.7	8.7	0.0		8.7	8.7	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	LFC	新大分(コンバインド)	42.2	42.2	0.0		53.5	61.3	7.8	(c)	54.3	59.4	5.1	(c)	53.2	53.2	0.0		51.3	51.3	0.0	
	合計	合計	59.7	59.7	0.0	—	71.0	78.8	7.8	—	84.2	89.3	5.1	—	74.3	74.3	0.0	—	72.4	72.4	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	合計	合計	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				
電力貯蔵装置の充電	電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
			▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 1.5	3.5	(c)	▲ 5.0	▲ 1.5	3.5	(c)	▲ 5.0	▲ 1.6	3.4	(c)	▲ 5.0	▲ 1.5	3.5	(c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0													
		B	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	64.1	9.7	(a)												
	電制電源を除く	火力他	15.1 [17%]	11.5 [13%]	▲ 3.6	(b)	15.1 [17%]	29.4 [33%]	14.3	(b)	19.7 [19%]	34.1 [34%]	14.4	(b)	19.2 [19%]	16.5 [16%]	▲ 2.7	(b)	19.5 [19%]	16.8 [17%]	▲ 2.7	(b)
		(43.6) [24%]					(43.6) [24%]				(43.0) [24%]				(43.0) [24%]				(43.0) [24%]			
		自家発余剰	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.4	▲ 9.7	(d)
	合計	合計	79.5	66.3	▲ 13.2		79.5	84.2	4.7		84.1	88.9	4.8		83.6	71.2	▲ 12.4		83.9	81.3	▲ 2.7	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		0.0 (153.5)	0.0	0.0		0.0 (163.5)	0.0	0.0		0.0 (175.9)	0.0	0.0		0.0 (166.9)	0.0	0.0		0.0 (177.6)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		11月8日(土)				11月10日(月)				11月14日(金)				11月15日(土)				11月16日(日)				

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年11月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26日(水)				11月28日(金)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	石炭	松浦	28.1	28.1	0.0		12.4	32.7	20.3	(a)	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0	
	石炭	芦北	8.7	8.7	0.0		8.7	8.7	0.0		8.7	8.7	0.0		17.5	17.5	0.0		17.5	17.5	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	LFC	新大分(コンバインド)	56.2	56.2	0.0		53.5	53.5	0.0		52.5	52.5	0.0		55.1	62.5	7.4	(c)	57.0	67.5	10.5	(f)
	合計		97.6	93.0	0.0	—	74.6	94.9	20.3	—	73.6	73.6	0.0	—	85.0	92.4	7.4	—	86.9	97.4	10.5	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26日(水)				11月28日(金)				
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0	
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)
	合計		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26日(水)				11月28日(金)				
電力貯蔵装置の充電	電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
			▲ 5.0	▲ 2.4	2.6	(c)	▲ 5.0	▲ 2.4	2.6	(c)	▲ 5.0	▲ 2.4	2.6	(c)	▲ 5.0	▲ 2.5	2.5	(c)	▲ 5.0	▲ 2.5	2.5	(c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26日(水)				11月28日(金)				
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
		A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0													
		B	54.4 [29%]	95.6	41.2	(a)	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	73.2	18.8	(a)	54.4 [29%]	99.0	44.6	(a)
		火力他	19.1 [19%]	41.5 [41%]	22.4	(b)	19.2 [19%]	17.3 [17%]	▲ 1.9	(b)	19.0 [19%]	16.3 [16%]	▲ 2.7	(b)	25.7 [20%]	43.0 [33%]	17.3	(b)	25.8 [20%]	37.1 [28%]	11.3	(b)
		電制電源を除く	(43.0) [24%]				(43.0) [24%]															
		自家発余剰	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)
	合計		83.5	137.6	54.1		83.6	72.1	▲ 11.5		83.4	71.1	▲ 12.3		90.2	116.7	27.4		90.2	136.4	47.1	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26日(水)				11月28日(金)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		※1 空容量 = (運用容量) - 約定済み域送電能力 - 三次調整力①②	85.9 (234.0)	0.0	▲ 85.9	(a)	0.0 (188.2)	0.0	0.0		0.0 (167.9)	0.0	0.0		3.6 (208.3)	3.6	0.0		0.0 (234.0)	0.0	0.0	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		11月21日(金)				11月22日(土)				11月23日(日)				11月26								

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況（2025年11月）

[万kW]											
優先給電ルールに基づく抑制、調整（1）		11月29日(土)				11月30日(日)					
調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	
（火力） LFC調整力 2%確保の発電	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		
		芦北	17.5	17.5	0.0		17.5	17.5	0.0		
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
		新大分（コンバインド）	53.1	63.6	10.5	(f)	52.7	63.2	10.5	(f)	
合計			83.0	93.5	10.5	—	82.6	93.1	10.5	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（2）		11月29日(土)				11月30日(日)					
揚水発電機の揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	
	大平	1	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
	小丸川	1	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		2	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		3	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
合計			▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（3）		11月29日(土)				11月30日(日)					
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）		
▲ 5.0			▲ 2.5	2.5	(c)	▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	(e)		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（4）		11月29日(土)				11月30日(日)					
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		
		B	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0		
	電制電源を除く	火力他	25.8 [19%]	17.5 [13%]	▲ 8.3	(b)	20.8 [17%]	16.9 [14%]	▲ 3.9	(b)	
		発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 () 内は、全設備運転時	(43.0) [24%]				(43.0) [24%]				
		自家発余剰	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)	
		合計	90.2	72.1	▲ 17.2		85.2	71.5	▲ 12.8		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（5）		11月29日(土)				11月30日(日)					
長周期広域周波数調整（連系線活用）	中国九州間連系線（関門連系線）	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）		
※1 空容量 = (運用容量) - 約定済み域外送電電力 - 三次調整力①②			3.6 (184.1)	0.0	▲ 3.6	(a)	0.0 (184.1)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（6）		11月29日(土)				11月30日(日)					
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）	合意した最低出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由（※）		
		34.7 [58%]	33.6	▲ 1.1	(c)	34.7 [58%]	33.4	▲ 1.3	(c)		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（7）		11月29日(土)				11月30日(日)					
地域資源バイオマス	電源合計	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	合意した最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)		
	出力抑制可	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—		
	出力抑制不可	—[0%]	28.3	—	A(62),B(34),C(5)	—[0%]	28.2	—	A(62),B(34),C(5)		

地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）


(※)差異理由 (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約
(b) 燃料貯蔵関係の出力変更

(c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止
(d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画
(e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
(f) その他

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年10月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻 (※)		10月26日(日) 11時30分～12時		10月27日(月) 12時30分～13時		10月28日(火) 12時30分～13時		10月29日(水) 12時～12時30分		10月30日(木) 12時30分～13時	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	70.3	71.3	97.2	71.3	71.7	70.9	70.9	78.2	78.2
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	79.0	112.8	319.9	319.9	320.1	320.3	320.3	320.3	320.3
		(L) 原子力	320.2	317.7	25.5	25.5	27.2	28.5	28.5	16.6	16.6
		(J) 一般水力	25.7	28.2	12.8	12.8	15.8	37.2	37.2	28.0	28.0
		(K) 地熱	11.8	11.8	34.9	34.9	36.4	672.5	672.5	9.0	9.0
		(H) バイオマス専焼電源	40.7	40.2	27.6	27.6	27.4	1,443.2	1,443.2	182.0	182.0
		(I) 地域資源バイオマス	26.1	27.7	798.9	798.9	811.0	855.0	855.0	201.0	201.0
		(E-1) 太陽光	680.5	709.3	16.0	16.0	22.5	177.4	177.4	3.9	3.9
		(E-2) 風力	25.3	37.8	112.0	112.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		想定誤差量	182.0	182.0	1,516.1	1,516.1	1,524.6	1,237.3	1,237.3	1,237.3	1,237.3
		エリア供給力 計①	1,461.6	1,538.8	875.0	875.0	896.8	1,443.2	1,443.2	1,443.2	1,443.2
	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	825.0	825.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 201.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 201.0	▲ 201.0	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 212.6	▲ 212.6	▲ 192.7	▲ 181.0	▲ 181.0	▲ 177.4	▲ 177.4
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 181.0	▲ 181.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整①②⑥	0.0	0.0	1,292.5	1,292.5	1,272.6	1,282.7	1,282.7	1,282.7	1,282.7
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,210.9	1,210.9	1,292.5	1,292.5	1,272.6	1,282.7	1,282.7	1,282.7	1,282.7
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
必要性 (万kW)		エリア供給力 計①	1,461.6	1,538.8	1,516.1	1,516.1	1,524.6	1,443.2	1,443.2	1,443.2	1,443.2
エリア需要等 計⑦		1,210.9	1,292.5	1,272.6	1,272.6	1,282.7	1,237.3	1,237.3	1,237.3	1,237.3	
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		250.7	246.3	243.5	243.5	241.9	205.9	205.9	205.9	205.9	

○需給状況イメージ図

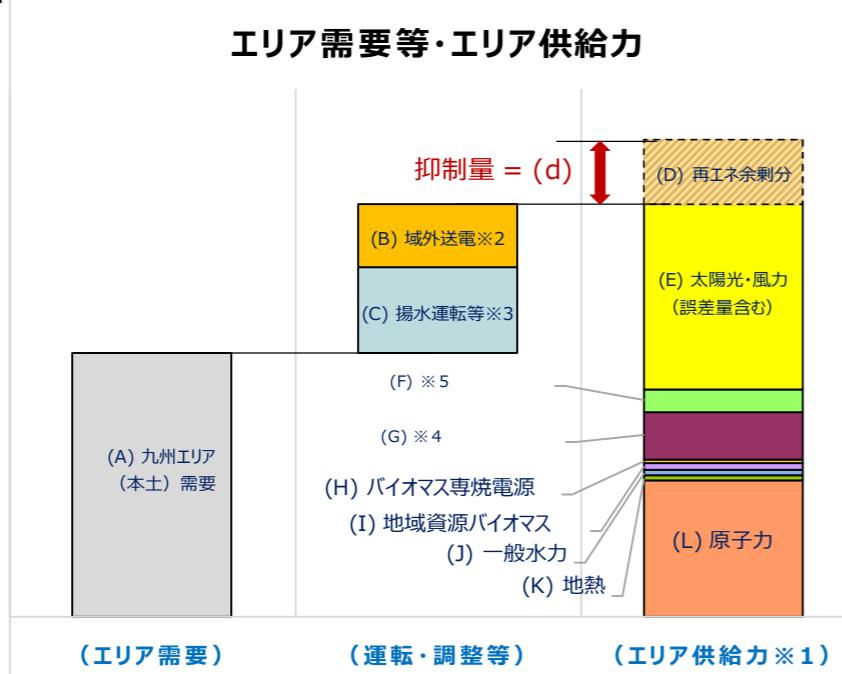

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

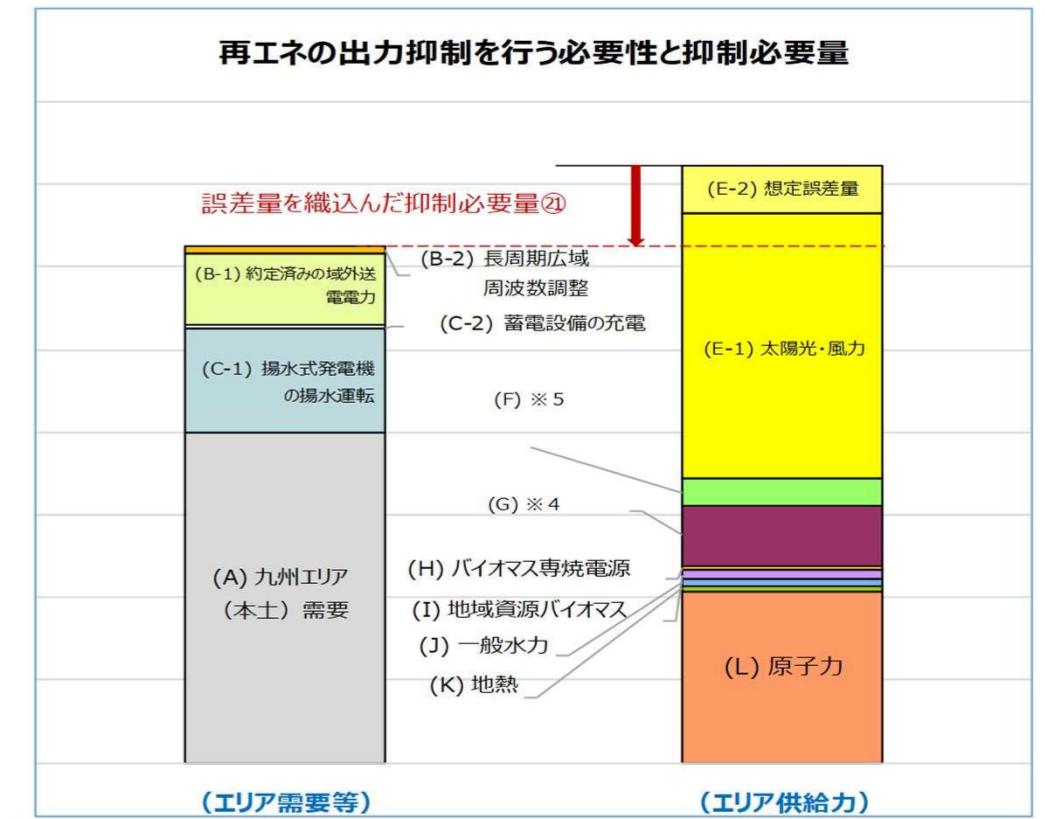

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年10月)

[万kW]


優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				10月30日(木)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0	
		芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	新大分(コンバインド)	34.8	49.1	14.3	(c)	35.8	50.1	14.3	(c)	35.8	50.1	14.3	(c)	36.2	50.5	14.3	(c)	35.4	49.7	14.3	(c)	
	合計	56.0	70.3	14.3	—	57.0	71.3	14.3	—	57.0	71.3	14.3	—	57.4	71.7	14.3	—	56.6	70.9	14.3	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				10月30日(木)				
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
	合計	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	▲ 253.2	▲ 201.0	52.2	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				10月30日(木)				
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	▲ 5.0	▲ 3.9	1.1	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				10月30日(木)				
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
		A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0													
		B	54.4 [29%]	64.1	9.7	(a)	54.4 [29%]	85.9	31.5	(a)	54.4 [29%]	69.6	15.2	(a)	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0	
		火力他	13.3 [15%]	14.4 [16%]	1.1	(b)	13.3 [15%]	26.4 [29%]	13.1	(b)	14.0 [16%]	27.1 [30%]	13.1	(b)	14.0 [16%]	25.6 [28%]	11.6	(b)	14.6 [16%]	23.2 [26%]	8.6	(b)
		電制電源を除く	(43.6) [24%]				(43.6) [24%]															
		自家発余剰	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.6	▲ 9.4	(d)
	合計	77.7	79.0	1.3	—	77.7	112.8	35.1	—	78.4	97.2	18.8	—	78.4	80.5	2.1	—	79.0	78.2	▲ 0.8	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				10月30日(木)				
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		0.0 ※1 空容量 = (運用容量) - 約定済み域送電能力 - 三次調整力①②	(181.0)	0.0	0.0		0.0 (214.6)	0.0	0.0		0.0 (198.3)	0.0	0.0		0.0 (183.1)	0.0	0.0		0.0 (179.5)	0.0	0.0	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)		10月26日(日)				10月27日(月)				10月28日(火)				10月29日(水)				1				

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性（2025年9月）

場所		九州本土		
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小时刻（※）		9月21日(日) 11時30分～12時		
		【前日計画】	【当日見直し】	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	99.8	
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	102.4	
		(L) 原子力	293.9	
		(J) 一般水力	33.5	
		(K) 地熱	11.6	
		(H) バイオマス専焼電源	42.7	
		(I) 地域資源バイオマス	28.3	
		(E-1) 太陽光	735.7	
		(E-2) 風力	25.9	
		想定誤差量	123.0	
エリア供給力 計①		1,496.8	当日見直しがあれば記載	
エリア 需要等	エリヤ 需要等	(A) エリア需要（本土）②	1,025.0	
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 253.2	
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.2	
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 125.5	
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①②⑥	0.0	
		エリア需要等 計⑦ = ② - (③ + ④ + ⑤ + ⑥)	1,407.9	
必要性 (万kW)	【前日計画】		【当日見直し】	
	エリア供給力 計①		1,496.8	
	エリア需要等 計⑦		1,407.9	
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧ = (① - ⑦)		88.9		

○需給状況イメージ図

エリア需要等・エリア供給力

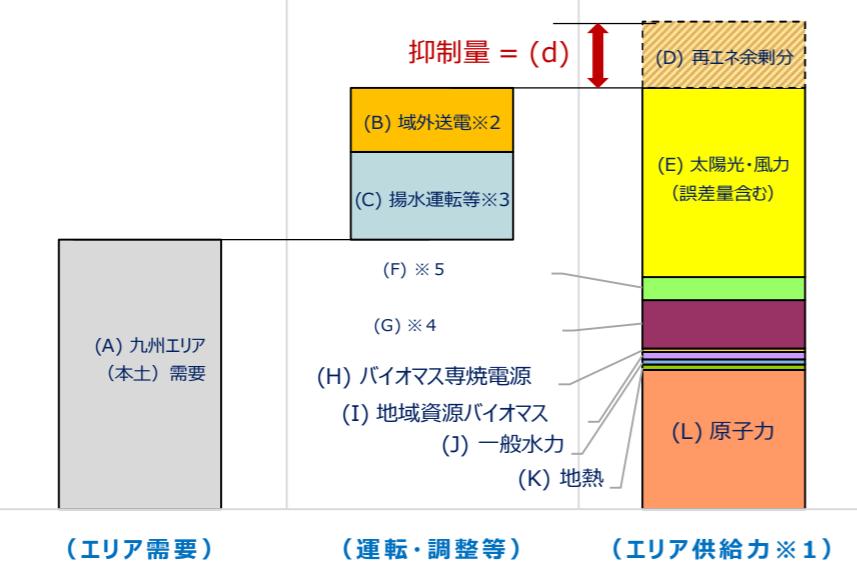

※ 1：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。

※ 2：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。


※ 3：蓄電設備の充電。

※ 4：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。

※ 5：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

再エネの出力抑制を行う必要性と抑制必要量

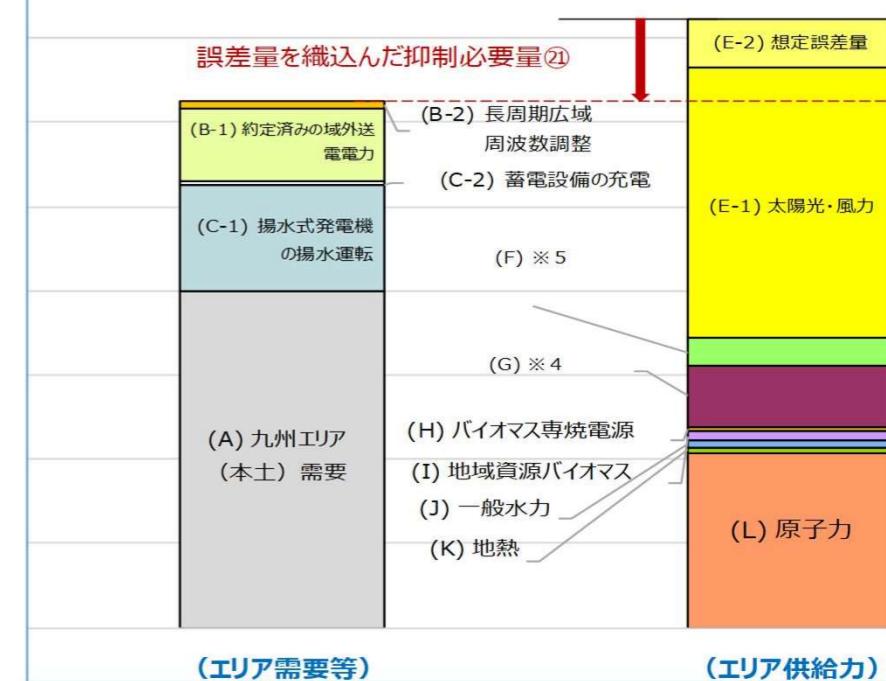

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況（2025年9月）

[万kW]					
優先給電ルールに基づく抑制、調整（1）		9月21日(日)			
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）
石炭	松浦	32.7	24.6	▲ 8.1	(c)
	苓北	17.5	17.5	0.0	
LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0	
	新大分（コンバインド）	57.7	57.7	0.0	
合計		107.9	99.8	▲ 8.1	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整（2）					
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）
	大平	1	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0
	合計		▲ 253.2	▲ 253.2	0.0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（3）					
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
		▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	(e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（4）					
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0
		B	54.4 [29%]	54.4	0.0
	電制電源を除く	火力他	33.4 [23%]	47.6 [32%]	14.2
			(43.6) [24%]		
		自家発余剰	10.0	0.4	▲ 9.6
	合計		97.8	102.4	4.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（5）					
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
		75.5 (201.0)	0.0	▲ 75.5	(a)
		※1 空容量 = (運用容量) -約定済み域外送電電力 -三次調整力①②			
優先給電ルールに基づく抑制、調整（6）					
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
		39.0 [58%]	42.7	3.7	(f)
		※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力			
優先給電ルールに基づく抑制、調整（7）					
地域資源バイオマス	電源合計	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)
		0.0	0.0	0.0	—
		—[0%]	28.3	—	A(62),B(34),C(4)

地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）

(※)差異理由 (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約
(b) 燃料貯蔵関係の出力変更


(c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止
(d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画

(e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
(f) その他

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性（2025年7月）

場所		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下げ調整力最小时刻（※）		7月19日(土) 11時30分～12時		7月20日(日) 11時30分～12時	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力）	103.3	101.5	
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等（火力）	105.7	104.9	
		(L) 原子力	409.6	409.8	
		(J) 一般水力	57.6	89.8	
		(K) 地熱	15.2	15.2	
		(H) バイオマス専焼電源	42.3	46.7	
		(I) 地域資源バイオマス	28.0	27.5	
		(E-1) 太陽光	755.2	747.9	当日見直しがあれば記載
		(E-2) 風力	16.7	16.0	当日見直しがあれば記載
		(E-2) 想定誤差量	181.0	181.0	
		エリア供給力 計①	1,714.6	1,740.3	
	エリア 需要等	(A) エリア需要（本土）②	1,235.0	1,145.0	
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 91.1	▲ 227.1	
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.0	▲ 4.0	
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 164.9	▲ 229.0	
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①②⑥	▲ 20.1	0.0	
		エリア需要等 計⑦=②-（③+④+⑤+⑥）	1,515.1	1,605.1	
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
必要性 (万kW)	エリア供給力 計①	1,714.6		1,740.3	
	エリア需要等 計⑦	1,515.1		1,605.1	
(D)	誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	199.5		135.2	

○需給状況イメージ図

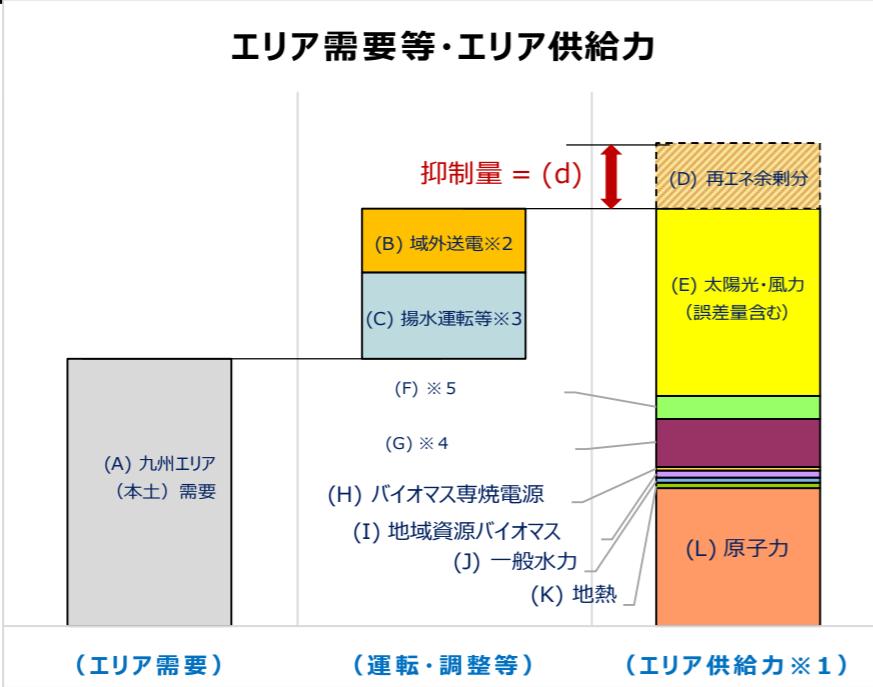

※1：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。


※2：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。

※3：蓄電設備の充電。

※4：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。

※5：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

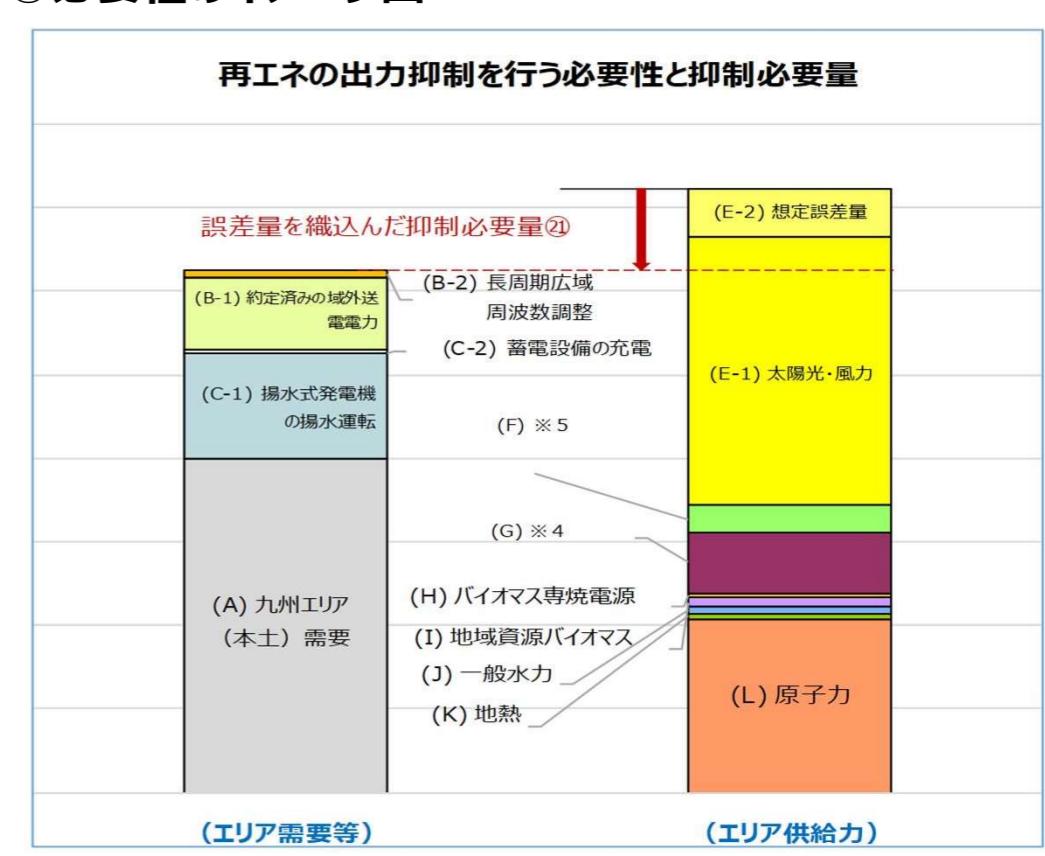

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況（2025年7月）

[万kW]											
優先給電ルールに基づく抑制、調整（1）		7月19日(土)				7月20日(日)					
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	石炭	松浦	32.7	32.7	0.0		32.7	32.7	0.0		
		苓北	8.7	8.7	0.0		8.7	8.7	0.0		
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
		新大分(コンバインド)	61.9	61.9	0.0		60.1	60.1	0.0		
	合計		103.3	103.3	0.0	—	101.5	101.5	0.0	—	
	優先給電ルールに基づく抑制、調整（2）										
	揚水発電機の 揚水運転		7月19日(土)				7月20日(日)				
	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
	小丸川	1	▲ 34.0	0.0	34.0	(f)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		2	▲ 34.0	0.0	34.0	(f)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		3	▲ 34.0	0.0	34.0	(f)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(f)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
	合計		▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（3）		7月19日(土)				7月20日(日)					
電力貯蔵装置の充電		豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			▲ 5.0	▲ 4.0	1.0	(e)	▲ 5.0	▲ 4.0	1.0	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（4）		7月19日(土)				7月20日(日)					
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		
		B	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0		
	電制電源 を除く	火力他	33.6 [23%]	49.0 [33%]	15.4	(b)	33.8 [23%]	49.1 [33%]	15.3	(b)	
		発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 () 内は、全設備運転時	(43.6) [24%]				(43.6) [24%]				
		自家発余剰	10.0	2.3	▲ 7.7	(d)	10.0	1.4	▲ 8.6	(d)	
		合計	98.0	105.7	7.7		98.1	104.9	6.7		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（5）		7月19日(土)				7月20日(日)					
長周期広域周波数調整 (連系線活用)		中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			64.2 (229.0)	20.1	▲ 44.1	(a)	0.0 (229.0)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（6）		7月19日(土)				7月20日(日)					
バイオマス専焼電源		電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			39.4 [59%]	42.3	2.9	(f)	39.3 [59%]	46.7	7.4	(f)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（7）		7月19日(土)				7月20日(日)					
地域資源バイオマス		電源合計	合意した最低 出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A～C毎 (発電所数)	合意した最低 出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	理由A～C毎 (発電所数)	
		出力抑制可	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
		出力抑制不可	—[0%]	28.0	—	A(62),B(34),C(4)	—[0%]	27.5	—	A(62),B(34),C(4)	


地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）

(※)差異理由 (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約
(b) 燃料貯蔵関係の出力変更 (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止
(d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
(f) その他

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年6月)


場所	出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)	九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土			
		6月1日(日) 【前日計画】	12時～12時30分 【当日見直し】	6月4日(水) 【前日計画】	12時～12時30分 【当日見直し】	6月5日(木) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	6月6日(金) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	6月17日(火) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】		
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	74.1	92.7	78.3	78.5	83.1	(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	58.1	66.2	68.5		
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(L) 原子力	297.4	291.5	297.2	297.5	352.8	(J) 一般水力	64.6	63.9	42.0	40.0	106.3
		(K) 地熱	14.5	14.5	14.5	14.5	16.0	(H) バイオマス専焼電源	40.1	38.6	35.0	33.1	31.0
		(I) 地域資源バイオマス	25.4	25.1	27.2	27.7	27.1	(E-1) 太陽光	961.3	964.6	956.8	797.3	808.3
		(E-2) 風力	3.5	11.0	4.1	2.8	11.8	(E-2) 想定誤差量	15.0	15.0	15.0	163.2	152.2
		エリア供給力 計①	1,554.0	1,583.1	1,538.6	1,522.8	1,663.1						
		(A) エリア需要 (本土) ②	785.0	1,003.9	995.0	1,005.0	1,235.0	(C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 159.1	▲ 91.1	▲ 159.1	▲ 227.1	▲ 160.6
		揚水運転等	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.7	(C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 177.7	▲ 187.7	▲ 182.6	▲ 182.6	▲ 280.9
		域外送電	▲ 0.0	30.9	13.2	0.0	96.8	(B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 0.0	1,256.2	1,327.9	1,419.1	1,584.4
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,126.2	1,256.2	1,327.9	1,419.1	1,663.1						
必要性 (万kW)		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】		
		エリア供給力 計①	1,554.0	1,583.1	1,538.6	1,522.8	1,663.1						
		エリア需要等 計⑦	1,126.2	1,256.2	1,327.9	1,419.1	1,584.4						
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	427.8	326.9	210.7	103.7	78.7						

○需給状況イメージ図

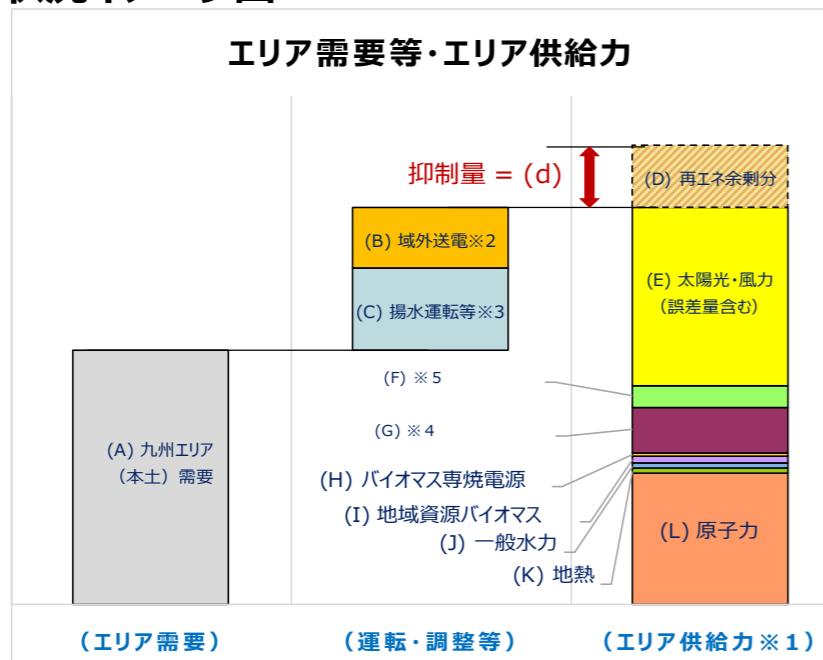

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

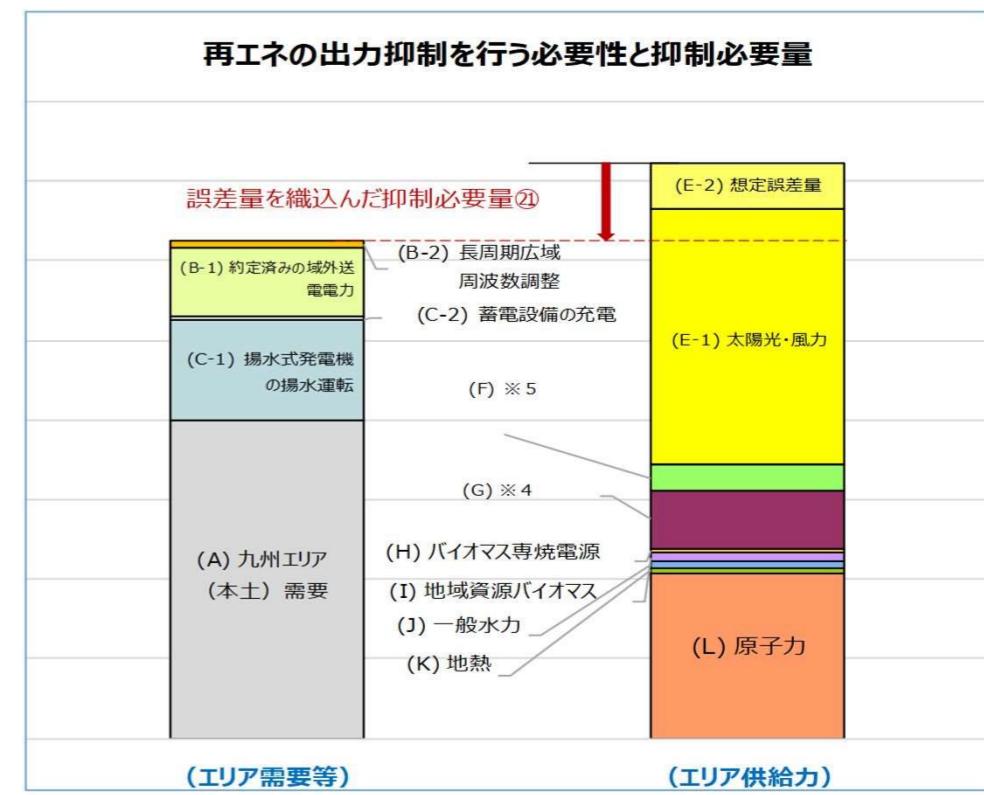


日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年6月)

場所	出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)	九州本土		九州本土		九州本土	
		6月19日(木) 12時30分～13時		6月28日(土) 12時～12時30分		6月29日(日) 11時～11時30分	
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	115.9	89.5	89.0	80.4	77.0
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	80.8	411.0	410.9	41.0	41.0
		(L) 原子力	408.9	45.0	44.2	16.2	16.2
		(J) 一般水力	100.0	28.6	28.3	35.6	35.6
		(K) 地熱	8.5	906.6	897.0	5.7	3.6
		(H) バイオマス専焼電源	30.9	35.4	23.5	35.4	35.4
		(I) 地域資源バイオマス	27.3	1,654.0	1,625.3	1,137.7	1,137.7
		(E-1) 太陽光	840.5	1,165.0	1,137.7	▲ 227.1	▲ 227.1
		風力	3.2	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 4.2	▲ 4.2
		(E-2) 想定誤差量	95.0	▲ 193.0	▲ 190.0	9.9	0.0
必要性 (万kW)	エリア 需要等	エリア供給力 計①	1,711.0	1,579.4	1,559.0	1,559.0	1,559.0
		(A) エリア需要 (本土) ②	1,255.0	1,654.0	1,625.3	1,625.3	1,625.3
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 193.1	▲ 193.0	▲ 190.0	▲ 190.0	▲ 190.0
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.2
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 217.9	9.9	0.0	0.0	0.0
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	19.1	1,579.4	1,559.0	1,559.0	1,559.0
		エリア需要等 計⑦ = ② - (③ + ④ + ⑤ + ⑥)	1,651.6	74.6	66.3	66.3	66.3
		エリア供給力 計①	1,711.0	1,654.0	1,625.3	1,625.3	1,625.3
		エリア需要等 計⑦	1,651.6	1,579.4	1,559.0	1,559.0	1,559.0
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧ = (① - ⑦)	59.4	74.6	66.3	66.3	66.3

○需給状況イメージ図

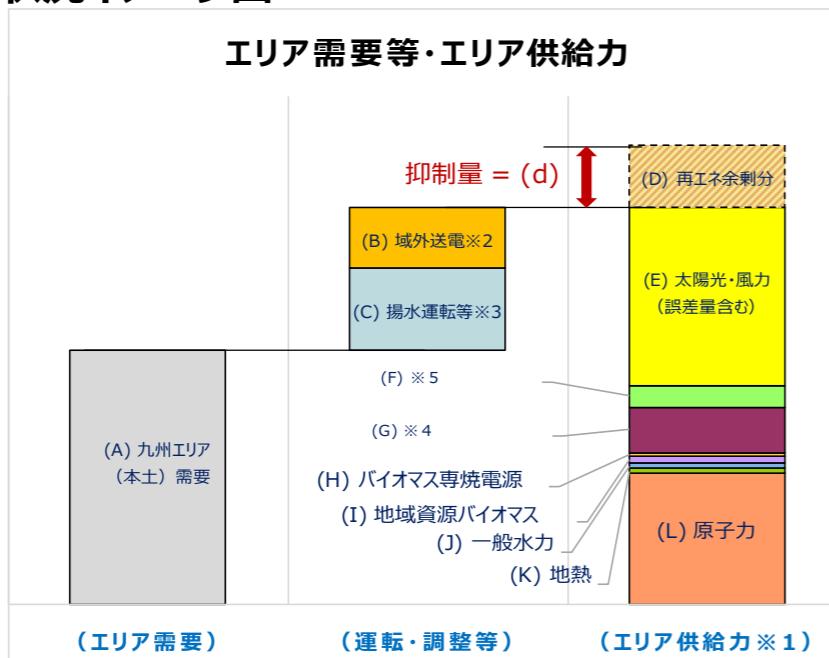

○必要性のイメージ図

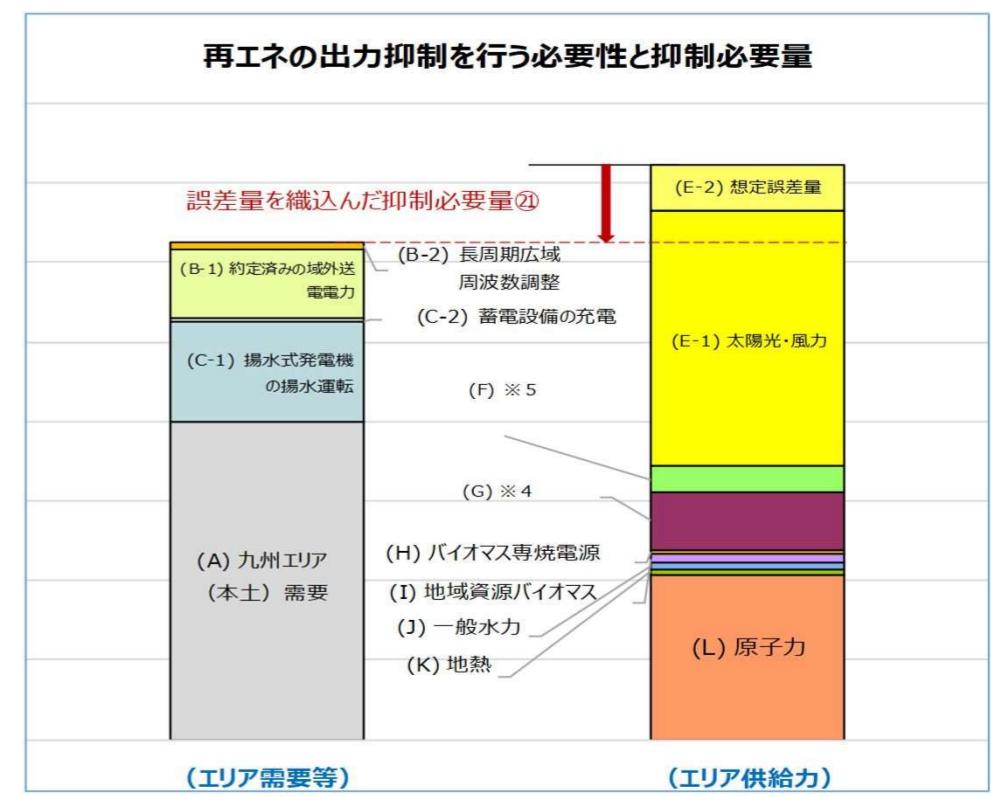

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年6月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				6月1日(日)				6月4日(水)				6月5日(木)				6月6日(金)				6月17日(火)							
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力)	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
L F C調整力 2%確保の発電	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0						
		芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0						
	L N G	新小倉	0.0	0.0	0.0		8.4	14.2	5.8	(b)	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
		新大分(コンバインド)	52.9	52.9	0.0		57.3	57.3	0.0		57.1	57.1	0.0		57.3	57.3	0.0		61.9	61.9	0.0						
合計			74.1	74.1	0.0	—	86.9	92.7	5.8	—	78.3	78.3	0.0	—	78.5	78.5	0.0	—	83.1	83.1	0.0	—					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																											
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)					
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0						
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	0.0	32.5	(c)					
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0						
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0						
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0						
		3	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0						
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)					
合計			▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 160.6	92.6	—					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																											
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
		▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.7	0.3	(e)		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																											
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	26.1	▲ 1.1	(f)	
	電制電源を除く	火力他	29.5 [22%]	30.1 [23%]	0.6	(b)	33.4 [23%]	38.3 [0%]	4.9	(b)	33.4 [23%]	40.7 [28%]	7.3	(b)	33.4 [23%]	40.2 [27%]	6.8	(b)	33.4 [23%]	46.3 [31%]	12.9	(b)	33.4 [23%]	(43.6) [24%]			
		自家発余剰	10.0	0.8	▲ 9.2	(d)	10.0	0.7	▲ 9.3	(d)	10.0	0.6	▲ 9.4	(d)	10.0	0.8	▲ 9.2	(d)	10.0	1.8	▲ 8.2	(d)	10.0	30.7	1.3	(c)	
合計			66.7	58.1	▲ 8.6		70.6	66.2	▲ 4.4		70.6	68.5	▲ 2.1		70.6	68.2	▲ 2.4		70.6	74.2	3.6		70.6	90.4	▲ 6.4	(a)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																											
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
		0.0 (177.7)	0.0	0.0	</																						

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況（2025年6月）

[万kW]														
優先給電ルールに基づく抑制、調整（1）	6月19日(木)				6月28日(土)				6月29日(日)					
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
石炭 (火) LFC調整力 2%確保の発電	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		20.3	20.3	0.0		20.3	20.3	0.0	
	石炭	芦北	17.5	41.1	23.6		8.7	8.7	0.0		8.7	8.7	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	LNG	新大分（コンバインド）	62.3	62.3	0.0		60.5	60.5	0.0		60.0	60.0	0.0	
合計			92.2	115.8	23.6	—	89.5	89.5	0.0	—	89.0	89.0	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整（2）														
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0	
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
合計			▲ 253.2	▲ 193.1	60.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整（3）														
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.7	0.3	(e)	▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	(e)	▲ 5.0	▲ 4.2	0.8	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（4）														
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0	
		B	27.2 [29%]	34.4	7.2	(a)	54.4 [29%]	54.4	0.0		54.4 [29%]	54.4	0.0	
	電制電源 を除く	火力他	33.4 [23%]	44.7 [30%]	11.3	(b)	33.4 [23%]	23.8 [16%]	▲ 9.6	(f)	33.4 [23%]	20.4 [14%]	▲ 13.0	(f)
		自家発余剰	10.0	1.4	▲ 8.6	(d)	10.0	1.9	▲ 8.1	(d)	10.0	1.9	▲ 8.1	(d)
合計			70.6	80.5	9.9		97.8	80.1	▲ 17.7		97.8	76.7	▲ 21.1	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（5）														
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		19.1 (207.8)	19.1	0.0		9.9 (193.0)	0.0	▲ 9.9	(a)	0.0 (190.0)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（6）														
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		29.4 [56%]	30.7	1.3	(c)	34.6 [58%]	35.4	0.8	(c)	34.6 [58%]	35.4	0.8	(c)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（7）														
地域資源バイオマス	電源合計	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	
		0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
	出力抑制可	—[0%]	27.4	—	A(61),B(33),C(4)	—[0%]	28.6	—	A(61),B(33),C(4)	—[0%]	28.3	—	A(61),B(33),C(4)	

地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）


(※)差異理由 (a)連系線運用容量の維持・他供給区域の制約
(b)燃料貯蔵関係の出力変更

(c)試運転・作業に伴う出力変更・停止
(d)自家発設備など工場の生産調整に基づく計画
(e)設備トラブルに伴う出力変更・停止
(f)その他

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年5月)


場所	出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)	九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
		5月1日(木) 12時30分～13時	【前日計画】	5月2日(金) 12時30分～13時	【前日計画】	5月3日(土) 11時30分～12時	【前日計画】	5月4日(日) 12時～12時30分	【前日計画】	5月5日(月) 11時30分～12時	【前日計画】
		【当日見直し】		【当日見直し】		【当日見直し】		【当日見直し】		【当日見直し】	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	82.2	当 日 見 直 し が あ れ ば 記 載	77.4	当 日 見 直 し が あ れ ば 記 載	75.8	当 日 見 直 し が あ れ ば 記 載	75.2	当 日 見 直 し が あ れ ば 記 載	76.4
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	23.2		18.6		18.2		18.0		20.5
		(L) 原子力	298.1		298.3		298.4		298.4		298.4
		(J) 一般水力	27.2		27.1		32.0		29.6		24.0
		(K) 地熱	16.8		16.8		16.8		16.8		16.8
		(H) バイオマス専焼電源	41.3		30.8		33.4		33.3		33.4
		(I) 地域資源バイオマス	30.6		29.4		30.2		30.6		30.5
		(E-1) 太陽光	490.0		961.0		940.9		965.5		624.6
		風力	21.1		21.8		18.6		11.8		11.6
		(E-2) 想定誤差量	308.0		61.8		69.0		61.5		308.0
需給状況 (万kW)	エリヤ 需要等	エリア供給力 計①	1,338.5		1,543.0		1,533.3		1,540.7		1,444.2
		(A) エリア需要 (本土) ②	795.0		785.0		705.0		675.0		735.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 227.1		▲ 227.1		▲ 227.1		▲ 227.1		▲ 227.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5		▲ 4.5		▲ 4.4		▲ 4.4		▲ 4.5
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 146.1		▲ 141.5		▲ 139.1		▲ 140.1		▲ 150.2
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	81.1		0.0		0.0		0.0		35.4
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,091.6		1,158.1		1,075.6		1,046.6		1,081.4
		【前日計画】	【当日見直し】		【前日計画】		【当日見直し】		【前日計画】		【前日計画】
		【前日計画】	【当日見直し】		【前日計画】		【当日見直し】		【前日計画】		【前日計画】
		【前日計画】	【当日見直し】		【前日計画】		【当日見直し】		【前日計画】		【前日計画】
必要性 (万kW)		エリア供給力 計①	1,338.5		1,543.0		1,533.3		1,540.7		1,444.2
		エリア需要等 計⑦	1,091.6		1,158.1		1,075.6		1,046.6		1,081.4
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	246.9		384.9		457.7		494.1		362.8

○需給状況イメージ図

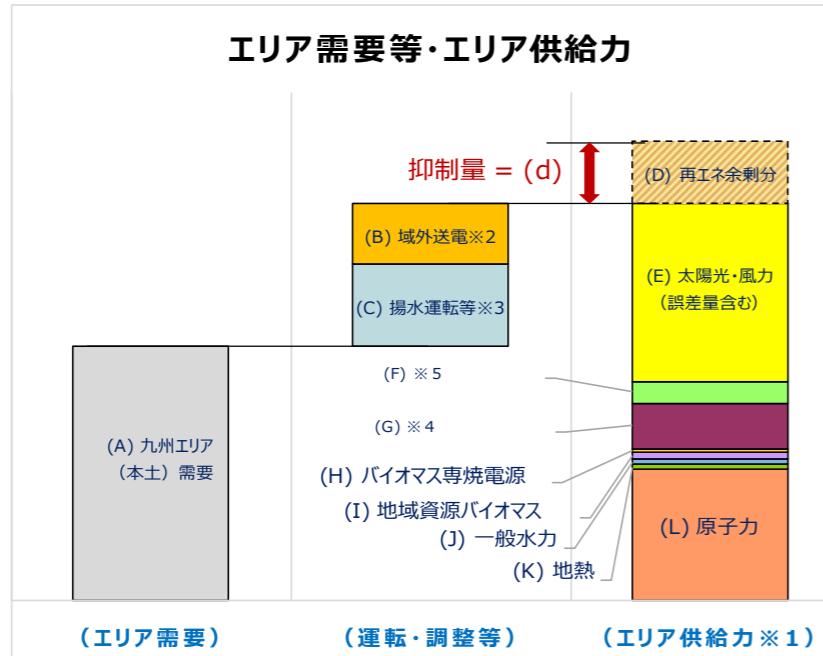

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

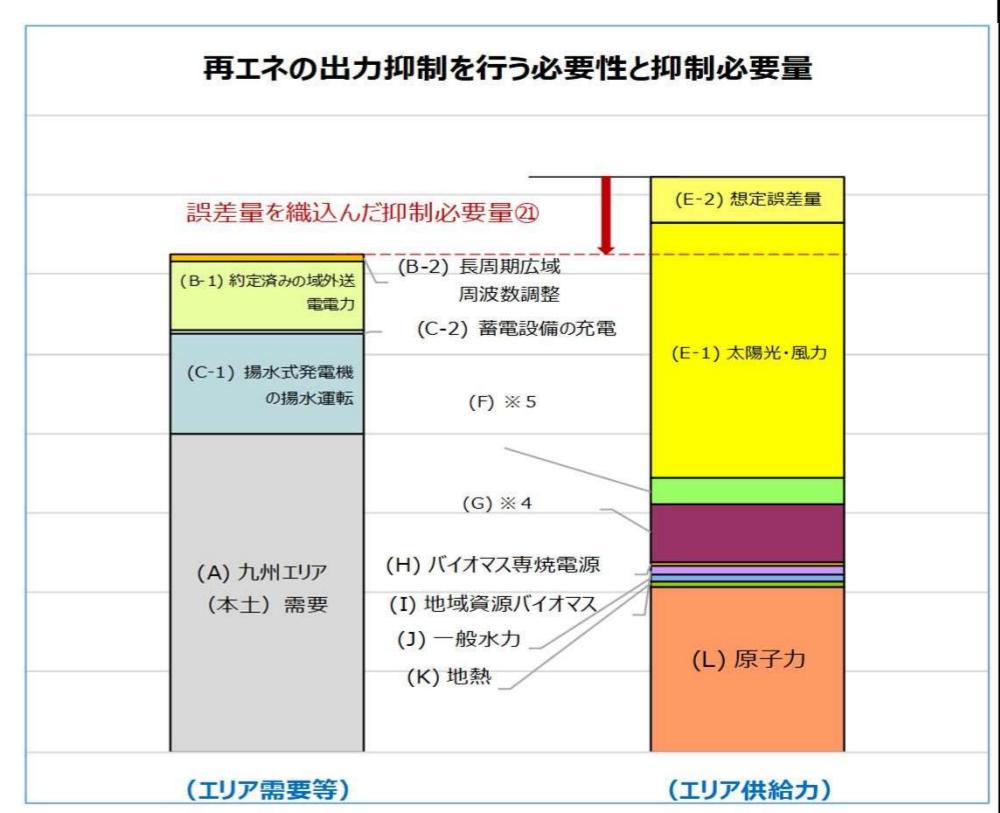

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年5月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		5月7日(水) 12時30分～13時	【前日計画】	5月8日(木) 12時30分～13時	【前日計画】	5月10日(土) 12時～12時30分	【前日計画】	5月12日(月) 12時30分～13時	【前日計画】	5月13日(火) 12時30分～13時	【前日計画】	
需給状況 (万kW)	供給力 エリア 需要等 エリア 需要等	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	78.0	79.0	77.9	98.4	76.3	76.3	76.3	76.3		
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	63.1	72.6	42.1	67.5	66.0	66.0	66.0	66.0		
		(L) 原子力	295.1	298.1	297.8	297.6	297.6	297.6	297.6	297.6		
		(J) 一般水力	27.2	30.7	34.7	59.3	43.8	43.8	43.8	43.8		
		(K) 地熱	16.8	16.8	16.8	14.9	16.7	16.7	16.7	16.7		
		(H) バイオマス専焼電源	31.5	32.0	29.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1		
		(I) 地域資源バイオマス	27.6	27.1	27.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8		
		(E-1) 太陽光	925.9	948.4	950.7	740.4	961.1	961.1	961.1	961.1		
		風力	8.4	9.4	19.1	7.0	7.8	7.8	7.8	7.8		
		(E-2) 想定誤差量	69.0	69.0	69.0	169.0	61.7	61.7	61.7	61.7		
エリア供給力 計①		1,542.6	1,583.1	1,564.9	1,509.0	1,585.9	895.0	895.0	895.0	895.0		
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	815.0	865.0	810.1	855.0	855.0	855.0	855.0	855.0		
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 91.1	▲ 91.1	▲ 91.1	▲ 91.1	▲ 91.1		
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4		
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 170.4	▲ 170.4	▲ 133.4	▲ 147.2	▲ 150.6	▲ 150.6	▲ 150.6	▲ 150.6		
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①②⑥	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		エリア需要等 計⑦=②-(③+④+⑤+⑥)	1,217.0	1,266.9	1,168.8	1,097.7	1,141.1	1,141.1	1,141.1	1,141.1		
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	
		エリア供給力 計①	1,542.6	1,583.1	1,564.9	1,509.0	1,585.9	1,585.9	1,585.9	1,585.9	1,585.9	1,585.9
		エリア需要等 計⑦	1,217.0	1,266.9	1,168.8	1,097.7	1,141.1	1,141.1	1,141.1	1,141.1	1,141.1	1,141.1
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	325.6	316.2	396.1	411.3	444.8	444.8	444.8	444.8	444.8	444.8

○需給状況イメージ図

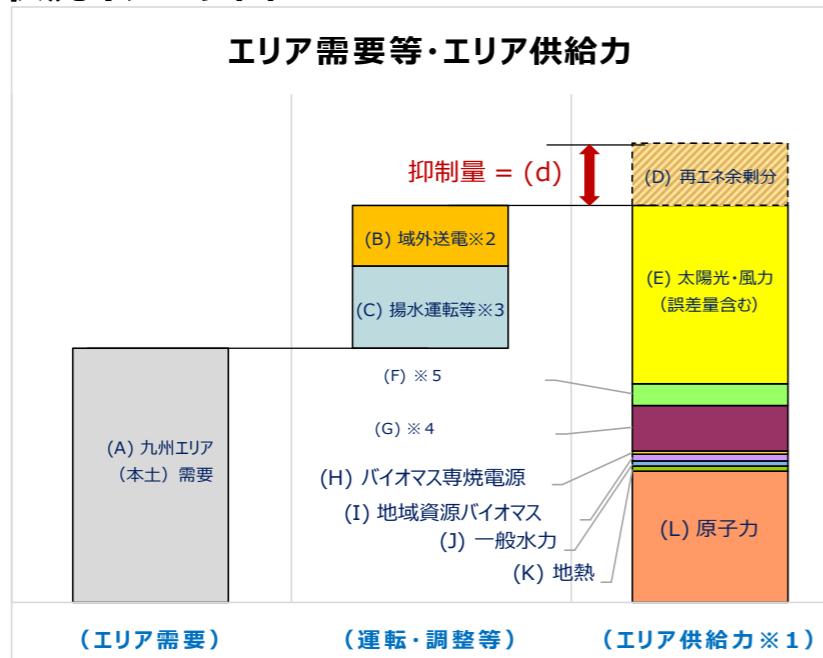

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線(関門連系線)の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

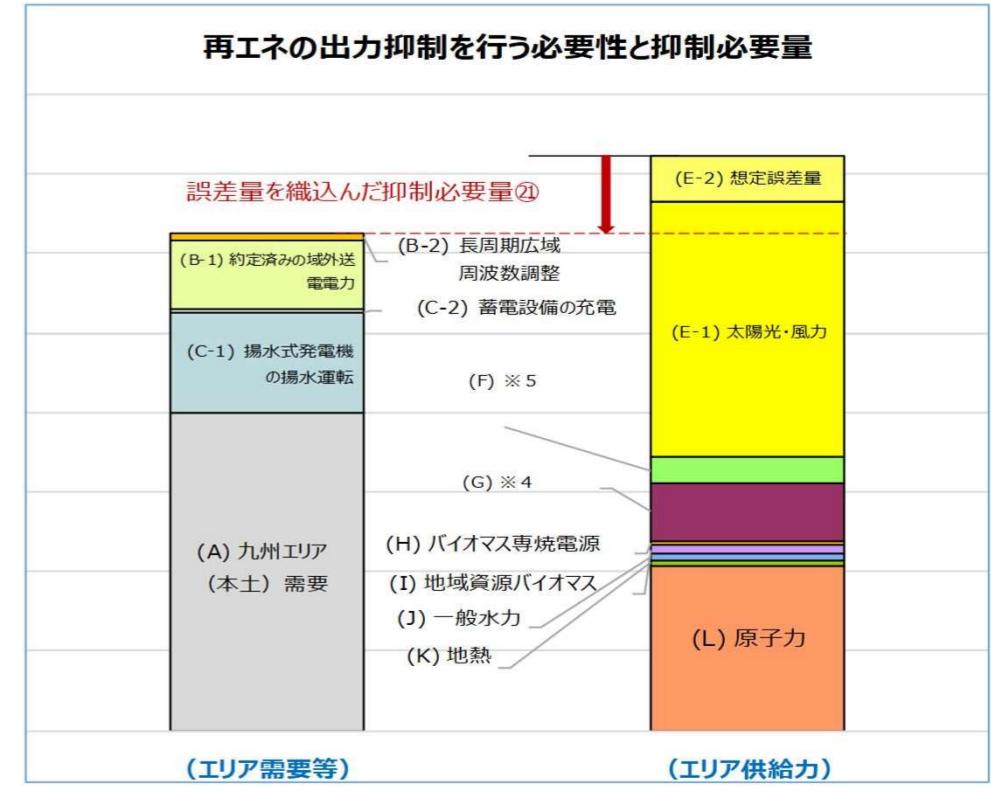

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年5月)


場所	出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)	九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
		5月14日(水) 12時00分～12時30分		5月15日(木) 12時30分～13時		5月19日(月) 12時30分～13時		5月22日(木) 12時30分～13時		5月23日(金) 12時30分～13時	
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	76.5	76.1	76.1	77.5	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	66.0	67.7	68.6	76.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
		(L) 原子力	297.6	297.6	294.4	297.3	297.1	297.1	297.1	297.1	297.1
		(J) 一般水力	43.2	40.3	53.5	48.3	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8
		(K) 地熱	16.8	16.8	16.1	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
		(H) バイオマス専焼電源	37.0	37.0	43.7	36.9	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
		(I) 地域資源バイオマス	25.4	24.1	25.0	25.2	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8
		(E-1) 太陽光	937.0	666.6	638.2	704.0	829.5	829.5	829.5	829.5	829.5
		風力	7.7	9.1	10.5	15.1	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
		(E-2) 想定誤差量	69.0	169.0	308.0	169.0	139.3	139.3	139.3	139.3	139.3
		エリア供給力 計①	1,576.2	1,404.3	1,534.1	1,464.3	1,587.6	1,587.6	1,587.6	1,587.6	1,587.6
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	903.8	885.0	885.0	955.0	985.0	985.0	985.0	985.0	985.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 145.6	▲ 143.6	▲ 143.6	▲ 151.2	▲ 172.3	▲ 172.3	▲ 172.3	▲ 172.3	▲ 172.3
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①②⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,212.9	1,192.1	1,192.1	1,269.7	1,320.8	1,320.8	1,320.8	1,320.8	1,320.8
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		エリア供給力 計①	1,576.2	1,404.3	1,534.1	1,464.3	1,587.6	1,587.6	1,587.6	1,587.6	1,587.6
		エリア需要等 計⑦	1,212.9	1,192.1	1,192.1	1,269.7	1,320.8	1,320.8	1,320.8	1,320.8	1,320.8
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	363.3	212.2	342.0	194.6	266.8	266.8	266.8	266.8	266.8

○需給状況イメージ図

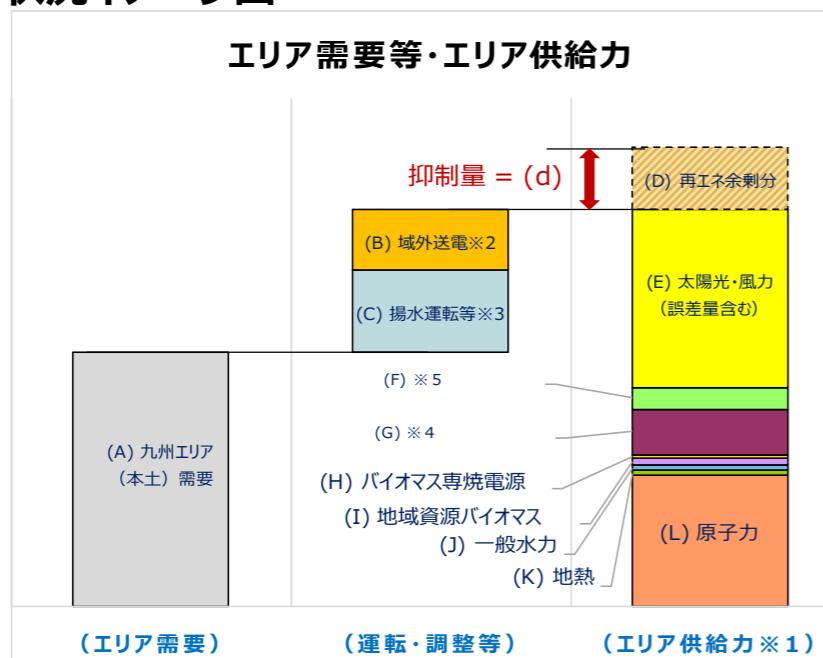

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

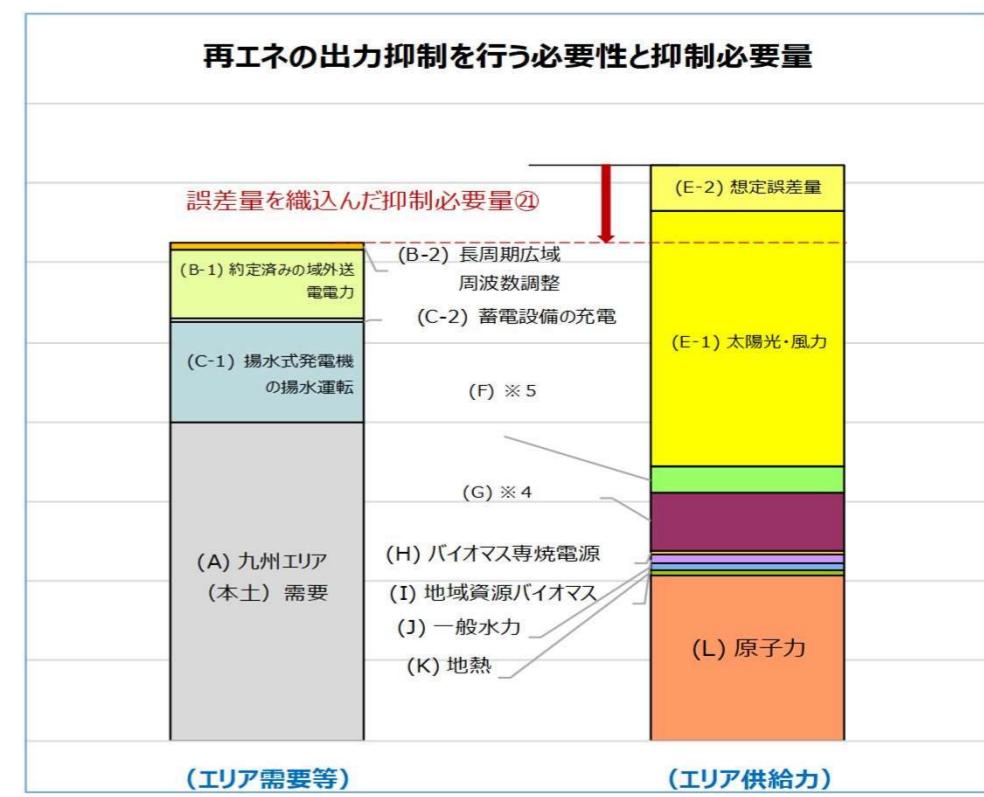

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年5月)


場所	出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)	九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	
		5月25日(日) 12時30分～13時	5月26日(月) 12時30分～13時	5月27日(火) 12時30分～13時	5月28日(水) 12時30分～13時	5月31日(土) 12時～12時30分	5月31日(土) 12時～12時30分	5月25日(日) 12時30分～13時	5月26日(月) 12時30分～13時	5月27日(火) 12時30分～13時	5月28日(水) 12時30分～13時	5月31日(土) 12時～12時30分
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	73.3	76.7	76.1	83.0	74.5	74.5	78.9	78.9	74.5	74.5
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	54.7	68.3	68.4	297.4	297.4	297.4	297.4	297.4	297.4	297.4
		(L) 原子力	297.5	294.7	297.3	84.6	63.8	84.6	84.6	84.6	63.8	63.8
		(J) 一般水力	88.0	82.3	87.3	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
		(K) 地熱	14.6	14.6	14.6	36.7	42.5	36.7	36.7	36.7	42.5	42.5
		(H) バイオマス専焼電源	36.0	34.6	32.7	25.5	25.5	24.7	24.7	24.7	25.5	25.5
		(I) 地域資源バイオマス	25.9	23.5	23.3	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
		(E-1) 太陽光	608.3	686.4	932.3	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
		風力	15.6	1.8	4.0	987.4	987.4	987.4	987.4	987.4	987.4	987.4
		(E-2) 想定誤差量	308.0	169.0	69.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0
		エリア供給力 計①	1,521.9	1,451.9	1,605.0	1,536.9	1,536.9	1,536.9	1,536.9	1,536.9	1,536.9	1,536.9
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	745.0	915.0	885.0	925.0	805.0	805.0	805.0	805.0	805.0	805.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1	▲ 159.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 174.1	▲ 183.8	▲ 185.4	▲ 185.8	▲ 165.4	▲ 165.4	▲ 165.4	▲ 165.4	▲ 165.4	▲ 165.4
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①②⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,082.6	1,262.3	1,233.9	1,274.3	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	
		エリア供給力 計①	1,521.9	1,451.9	1,605.0	1,536.9	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0	1,621.0
		エリア需要等 計⑦	1,082.6	1,262.3	1,233.9	1,274.3	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9	1,133.9
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	439.3	189.6	371.1	262.6	487.1	487.1	487.1	487.1	487.1	487.1

○需給状況イメージ図

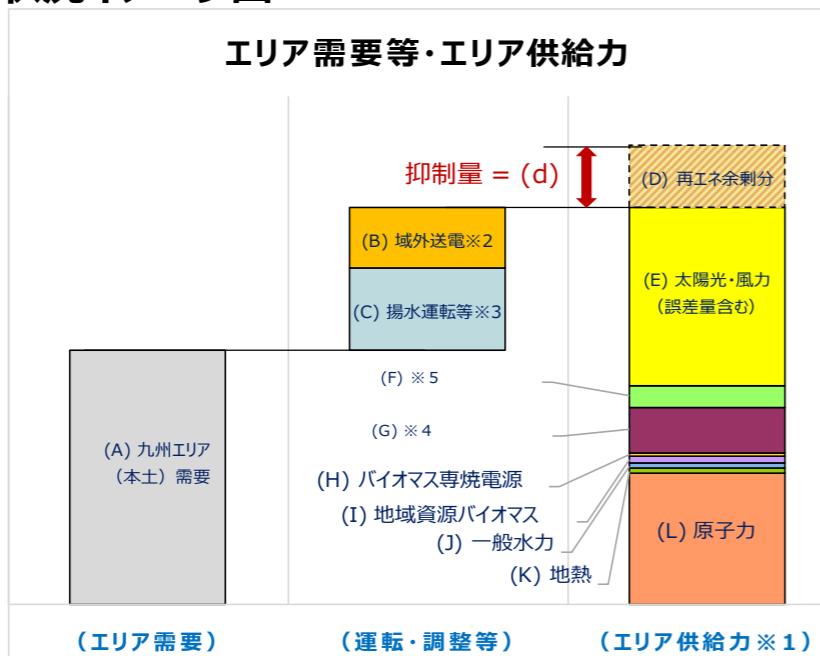

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線 (関門連系線) の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

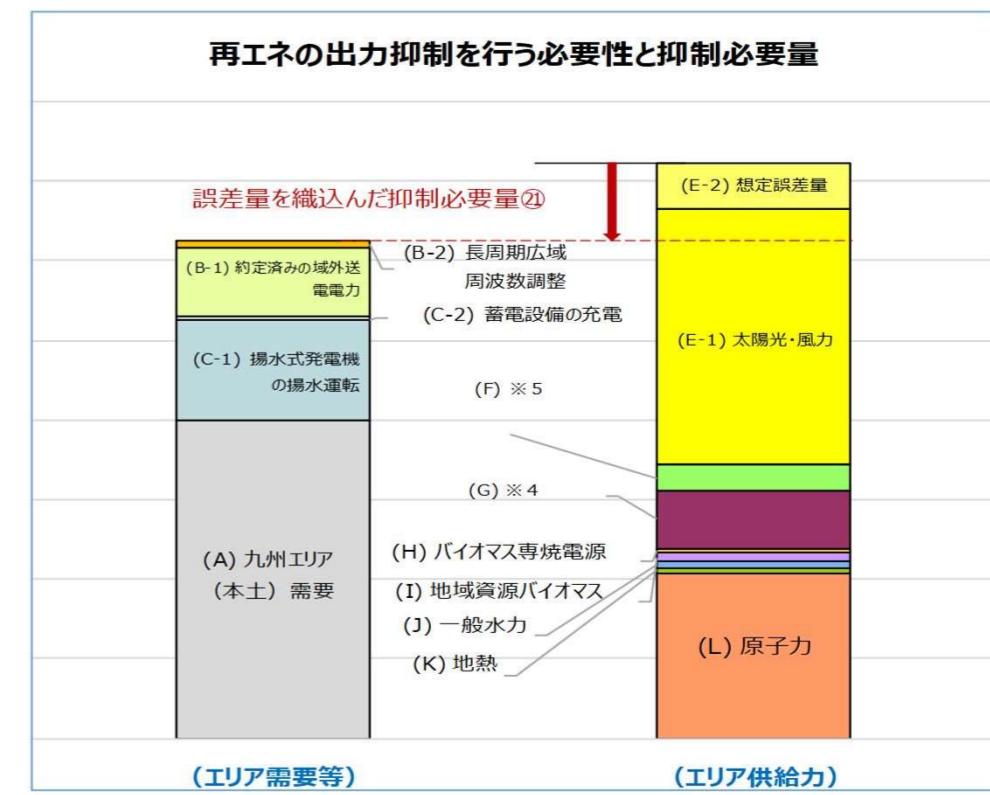

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年5月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				5月1日(木)				5月2日(金)				5月3日(土)				5月4日(日)				5月5日(月)						
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	石炭	松浦	20.3	20.3	0.0		15.7	15.7	0.0		15.7	15.7	0.0		15.7	15.7	0.0		15.7	15.7	0.0					
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0					
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					
	LFC	新大分(コンバインド)	53.1	53.1	0.0		52.9	52.9	0.0		51.3	51.3	0.0		50.7	50.7	0.0		51.9	51.9	0.0					
	合計		82.2	82.2	0.0	—	77.4	77.4	0.0	—	75.8	75.8	0.0	—	75.2	75.2	0.0	—	76.4	76.4	0.0	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																										
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)				
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0					
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
	合計		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																										
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																										
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力) 電制電源を除く	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0																	
		B	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0																	
	電制電源を除く	火力他	23.9 [20%]	22.8 [19%]	▲ 1.1	(f)	23.9 [20%]	18.2 [15%]	▲ 5.7	(f)	23.9 [20%]	17.8 [15%]	▲ 6.1	(f)	23.9 [20%]	17.7 [14%]	▲ 6.2	(f)	23.9 [20%]	20.2 [17%]	▲ 3.7	(f)	(43.6) [24%]			
		自家発余剰	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	33.9	23.2	▲ 10.7	
	合計		33.9	23.2	▲ 10.7		33.9	18.6	▲ 15.3		33.9	18.2	▲ 15.7		33.9	18.0	▲ 15.9		33.9	20.5	▲ 13.4		33.9	20.5	▲ 13.4	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																										
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		81.1 (147.4)	0.0	▲ 81.1	(a)	0.0 (142.8)	0.0	0.0		0.0 (139.1)	0.0	0.0		0.0 (140.1)	0.0	0.0		35.4 (139.1)	11.1	▲ 24.3	(a)					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																										

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年5月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				5月7日(水)				5月8日(木)				5月10日(土)				5月12日(月)				5月13日(火)			
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	石炭	松浦	15.7	15.7	0.0		15.7	15.7	0.0		15.7	15.7	0.0		35.3	35.3	0.0		12.4	12.4	0.0		
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	新大分(コンバインド)	新大分(コンバインド)	53.5	53.5	0.0		54.5	54.5	0.0		53.4	53.4	0.0		54.3	54.3	0.0		55.1	55.1	0.0		
合計				78.0	78.0	0.0	—	79.0	79.0	0.0	—	77.9	77.9	0.0	—	98.4	98.4	0.0	—	76.3	76.3	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																							
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
	合計		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	▲ 253.2	▲ 91.1	162.1	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																							
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所		充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																							
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力) 電制電源を除く	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	17.5	▲ 9.7	(c)	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		
	電制電源を除く	火力他	23.9 [20%]	35.4 [29%]	11.5	(b)	29.5 [22%]	44.9 [34%]	15.4	(b)	29.5 [22%]	24.3 [0%]	▲ 5.2	(f)	29.5 [22%]	40.0 [30%]	10.5	(b)	29.5 [22%]	38.5 [29%]	9.0	(b)	
		自家発余剰	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	
	合計		61.1	63.1	2.0		66.7	72.6	5.9		66.7	42.1	▲ 24.6		66.7	67.5	0.8		66.7	66.0	▲ 0.7		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																							
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)		前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			0.0 (180.0)	0.0	0.0		0.0 (180.0)	0.0	0.0		0.0 (127.2)	0.0	0.0		0.0 (147.2)	0.0	0.0		0.0 (150.6)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																							
バイオマス専焼電源	電源合計		合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)</														

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年5月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				5月14日(水)				5月15日(木)				5月19日(月)				5月22日(木)				5月23日(金)						
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0					
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0					
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					
	LFC	新大分(コンバインド)	55.3	55.3	0.0		54.9	54.9	0.0		54.9	54.9	0.0		56.3	56.3	0.0		56.9	56.9	0.0					
	合計		108.9	108.9	0.0	—	76.1	76.1	0.0	—	76.1	76.1	0.0	—	77.5	77.5	0.0	—	78.1	78.1	0.0	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																										
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)				
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0					
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		3	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)				
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)				
	合計		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																										
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																										
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力) 電制電源を除く	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0																	
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	34.8	7.6	(a)	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0	
	電制電源を除く	火力他	29.5 [22%]	38.5	9.0	(b)	29.5 [22%]	40.2	10.7	(b)	29.5 [22%]	40.8	11.3	(b)	29.5 [22%]	41.2	11.7	(b)	29.5 [22%]	41.0	11.5	(b)	29.5 [22%]	41.0	11.5	(b)
		自家発余剰	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.4	▲ 9.6	(d)	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)
	合計		129.8	137.0	7.2		66.7	67.7	1.0		66.7	68.5	1.8		66.7	76.4	9.7		66.7	68.4	1.7		66.7	68.4	1.7	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																										
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		0.0 (145.6)	0.0	0.0		0.0 (143.6)	0.0	0.0		0.0 (143.6)	0.0	0.0		0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (176.7)	0.0	0.0		0.0 (176.7)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																										

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年5月)


[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				5月25日(日)				5月26日(月)				5月27日(火)				5月28日(水)				5月31日(土)			
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
石炭 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	松浦	12.4	12.4	0.0			12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		
	芦北	8.8	8.8	0.0			8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	新大分(コンバインド)	52.1	52.1	0.0			55.5	55.5	0.0		54.9	54.9	0.0		61.8	61.8	0.0		53.3	53.3	0.0		
合計				73.3	73.3	0.0	—	76.7	76.7	0.0	—	76.1	76.1	0.0	—	83.0	83.0	0.0	—	74.5	74.5	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																							
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		3	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
		4	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	
	合計		▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																							
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所		充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	▲ 5.0	▲ 4.4	0.6	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																							
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力) 電制電源を除く	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0																		
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0																		
	電制電源を除く	火力他	29.5 [22%]	26.6	▲ 2.9	(f)	29.5 [22%]	40.4	10.9	(b)	29.5 [22%]	40.8	11.3	(b)	29.5 [22%]	51.4	21.9	(b)	29.5 [22%]	22.0	▲ 7.5	(f)	
		自家発余剰	(43.6) [24%]	26.6	▲ 2.9	(f)	(43.6) [24%]	40.4	10.9	(b)	(43.6) [24%]	40.8	11.3	(b)	(43.6) [24%]	51.4	21.9	(b)	(43.6) [24%]	22.0	▲ 7.5	(f)	
	合計		66.7	54.7	▲ 12.0		66.7	68.3	1.6		66.7	68.4	1.7		66.7	78.9	12.2		66.7	49.5	▲ 17.2		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																							
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)		前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
			0.0 (174.1)	0.0	0.0		0.0 (184.7)	0.0	0.0		0.0 (187.7)	0.0	0.0	(a)	0.0 (186.7)	0.0	0.0		0.0 (166.7)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																							
バイオマス専焼電源	電源合計		合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%																

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年4月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		4月2日(水) 12時30分～13時	4月3日(木) 12時30分～13時	4月4日(金) 12時30分～13時	4月5日(土) 12時30分～13時	4月6日(日) 11時30分～12時					
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	92.4	92.2	92.0	74.7	73.3				
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	96.0	157.2	171.2	49.5	41.0				
		(L) 原子力	295.3	298.5	298.6	298.6	298.7				
		(J) 一般水力	32.2	30.2	31.0	29.2	27.9				
		(K) 地熱	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7				
		(H) バイオマス専焼電源	36.6	37.7	40.6	40.6	41.7				
		(I) 地域資源バイオマス	29.1	29.2	28.9	30.0	29.1				
		(E-1) 太陽光	837.9	912.1	1,003.5	530.3	997.1				
		風力	10.9	14.2	6.6	20.9	15.3				
		(E-2) 想定誤差量	180.8	32.0	19.0	401.0	19.0				
		エリア供給力 計①	1,627.9	1,620.0	1,708.1	1,491.5	1,559.8				
	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	915.0	905.0	895.0	815.0	744.8				
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 194.6	▲ 194.6	▲ 162.1	▲ 194.6	▲ 194.6				
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5				
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 220.6	▲ 226.0	▲ 226.0	▲ 182.4	▲ 153.3				
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	0.0	0.0	0.0	29.1	0.0				
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,334.7	1,330.1	1,287.6	1,167.4	1,097.2				
必要性 (万kW)	【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
	エリア供給力 計①		1,627.9	1,620.0	1,708.1	1,491.5	1,559.8				
	エリア需要等 計⑦		1,334.7	1,330.1	1,287.6	1,167.4	1,097.2				
(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		293.2	289.9	420.5	324.1	324.1	462.6				

○需給状況イメージ図

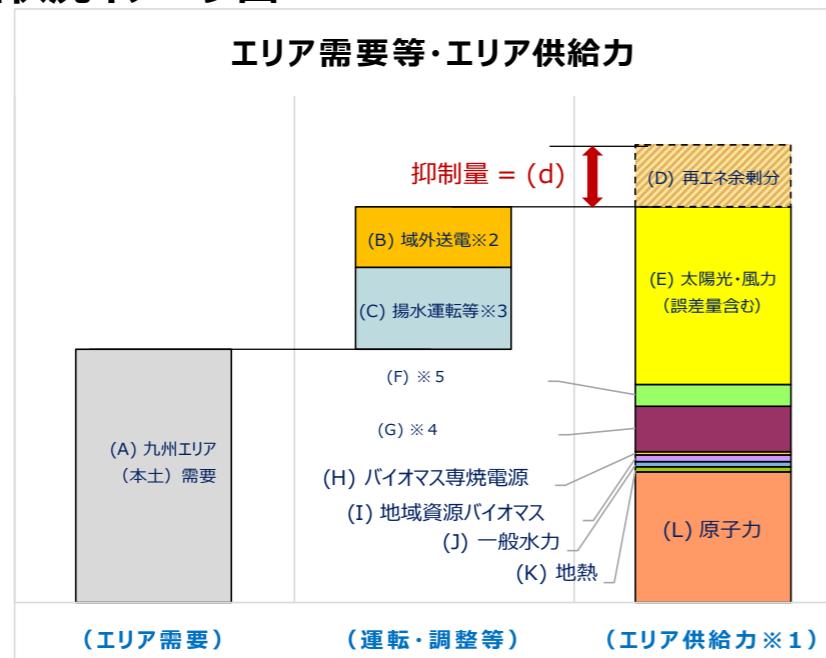

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

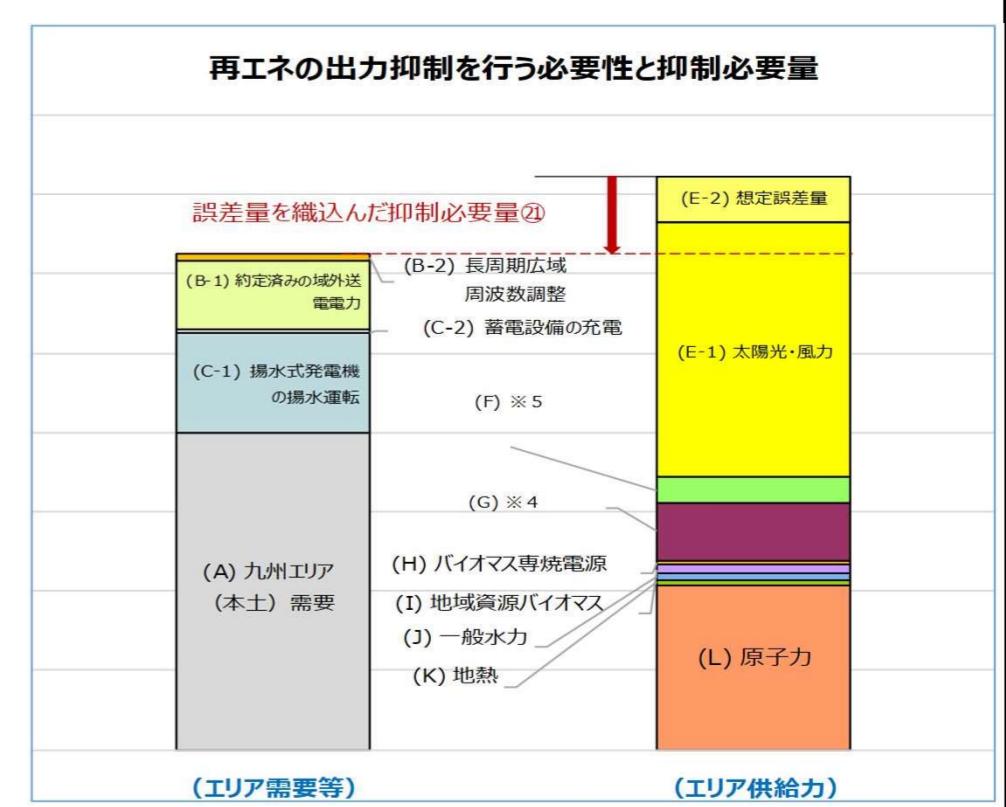

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年4月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		4月7日(月) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	4月8日(火) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	4月9日(水) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	4月11日(金) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】	4月13日(日) 【前日計画】	12時30分～13時 【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	75.5	75.9	75.7	75.7	75.7	75.7	72.9	72.9	72.9
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	60.0	59.8	59.0	59.0	70.5	70.5	48.2	48.2	48.2
		(L) 原子力	298.5	298.5	298.5	298.5	298.5	298.5	298.3	298.3	298.3
		(J) 一般水力	28.4	20.7	27.6	25.3	25.3	27.1	27.1	27.1	27.1
		(K) 地熱	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
		(H) バイオマス専焼電源	38.7	43.1	41.5	40.7	40.7	35.3	35.3	35.3	35.3
		(I) 地域資源バイオマス	25.6	26.9	27.1	24.7	24.7	25.9	25.9	25.9	25.9
		(E-1) 太陽光	1,011.4	1,005.5	1,002.9	1,017.2	1,017.2	1,001.9	1,001.9	1,001.9	1,001.9
		風力	8.5	18.0	10.0	9.6	9.6	31.5	31.5	31.5	31.5
		(E-2) 想定誤差量	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
	エリア供給力 計①		1,582.3	1,584.1	1,578.0	1,597.9	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	855.0	875.0	865.0	865.0	865.0	865.0	725.0	725.0	725.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 193.1	▲ 193.1	▲ 159.1	▲ 193.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 141.5	▲ 141.5	▲ 141.5	▲ 142.6	▲ 144.2	▲ 144.2	▲ 144.2	▲ 144.2	▲ 144.2
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
	エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)		1,194.1	1,214.1	1,170.0	1,205.2	1,205.2	1,090.2	1,090.2	1,090.2	1,090.2
	エリア供給力 計①		1,582.3	1,584.1	1,578.0	1,597.9	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8
	エリア需要等 計⑦		1,194.1	1,214.1	1,170.0	1,205.2	1,205.2	1,090.2	1,090.2	1,090.2	1,090.2
	(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		388.2	370.0	408.0	392.7	392.7	486.6	486.6	486.6	486.6

○需給状況イメージ図

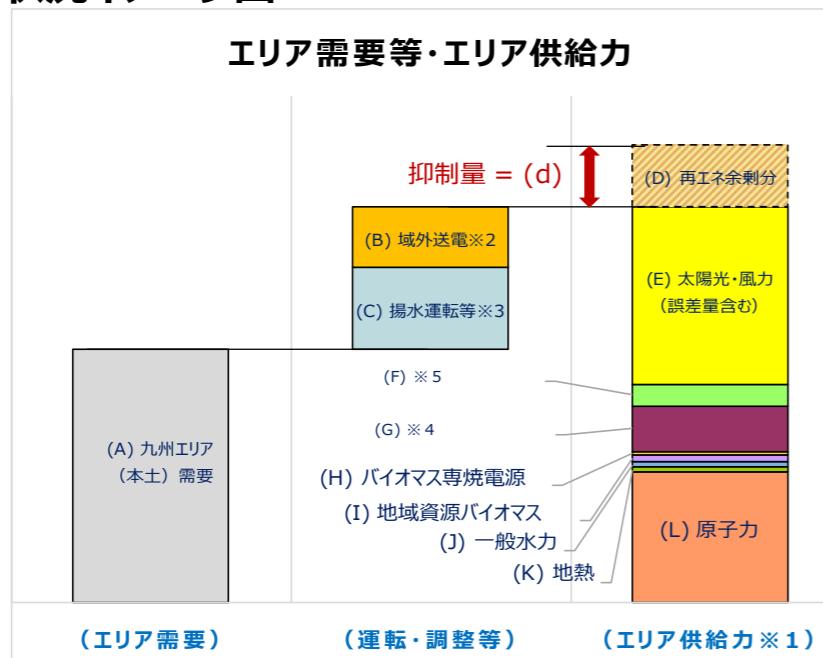

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

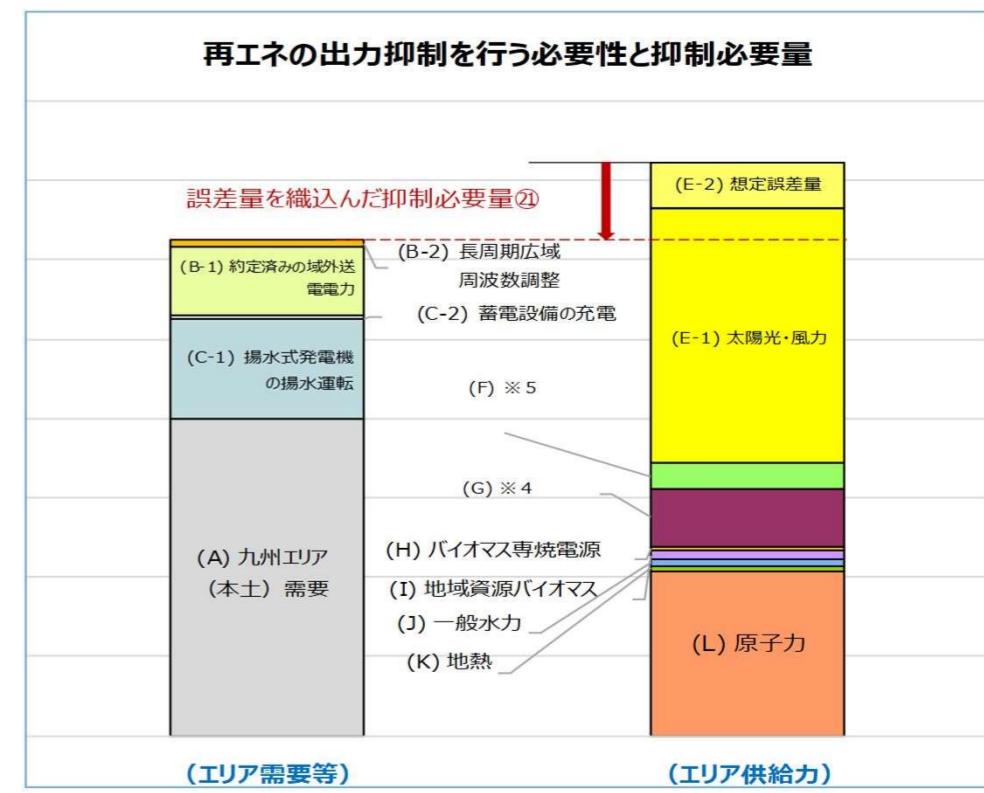

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年4月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		4月15日(火) 12時30分～13時		4月16日(水) 12時30分～13時		4月17日(木) 12時30分～13時		4月18日(金) 12時30分～13時		4月19日(土) 12時30分～13時	
		【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	76.3	当日見直しがあれば 記載	75.3	当日見直しがあれば 記載	75.7	当日見直しがあれば 記載	76.1	当日見直しがあれば 記載	73.9
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	62.6		60.2		57.9		62.9		50.7
		(L) 原子力	298.4		298.2		298.4		298.7		298.5
		(J) 一般水力	24.0		25.9		31.7		24.1		29.6
		(K) 地熱	16.7		16.7		16.7		16.7		16.7
		(H) バイオマス専焼電源	43.8		35.3		34.6		34.6		30.7
		(I) 地域資源バイオマス	24.9		24.6		25.2		26.2		28.6
		(E-1) 太陽光	876.8		997.0		913.4		745.4		1,010.1
	(E-2) 想定誤差量	風力	36.2		17.4		22.6		11.6		12.1
		想定誤差量	141.9		19.0		32.0		234.0		19.0
	エリア供給力 計①		1,601.6		1,569.6		1,508.2		1,530.3		1,569.9
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	895.0		845.0		865.0		885.0		775.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 227.1		▲ 159.1		▲ 227.1		▲ 227.1		▲ 227.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5		▲ 4.5		▲ 4.5		▲ 4.5		▲ 4.5
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 142.6		▲ 142.6		▲ 142.6		▲ 142.6		▲ 123.0
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)		1,269.2		1,151.2		1,239.2		1,259.2		1,129.6
	エリア供給力 計①		1,601.6		1,569.6		1,508.2		1,530.3		1,569.9
	エリア需要等 計⑦		1,269.2		1,151.2		1,239.2		1,259.2		1,129.6
	(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)		332.4		418.4		269.0		271.1		440.3

○需給状況イメージ図

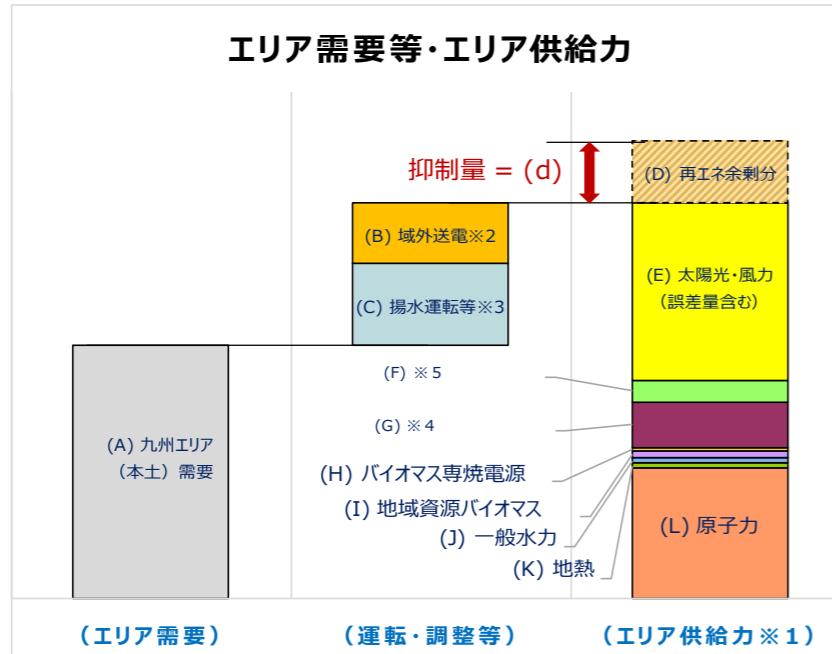

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

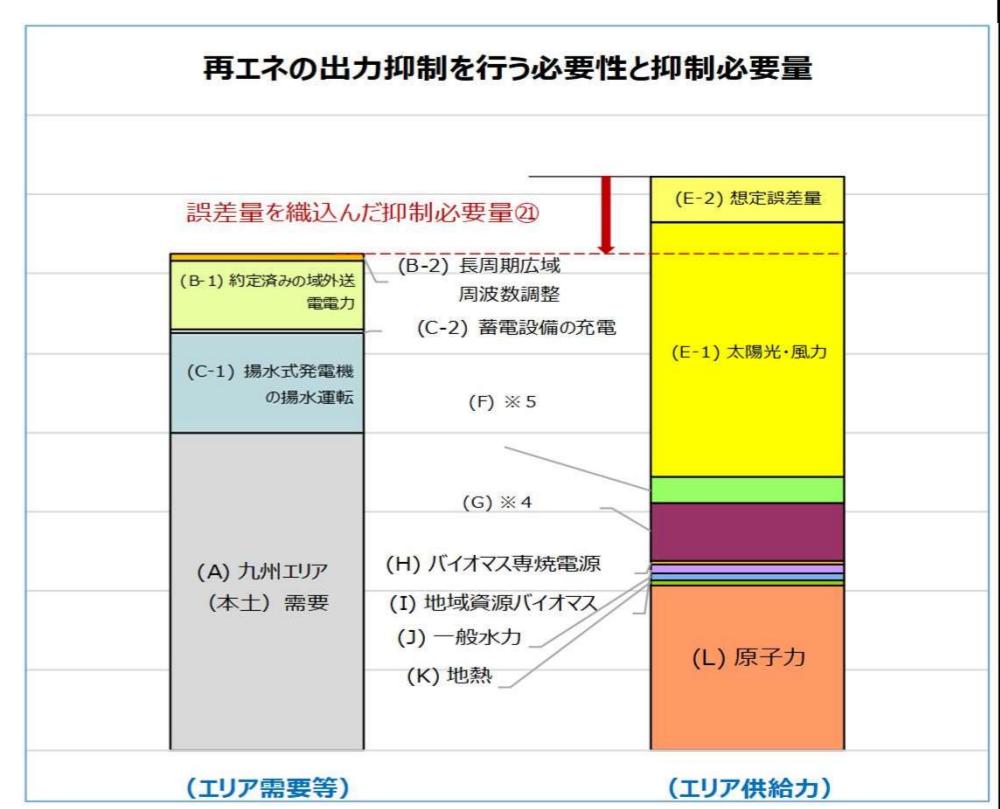

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年4月)


場所		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		4月21日(月) 12時30分~13時		4月24日(木) 12時30分~13時		4月25日(金) 12時30分~13時		4月26日(土) 12時30分~13時		4月27日(日) 12時30分~13時	
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	75.9	75.5	75.7	74.5	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	61.3	57.1	50.1	20.4	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
		(L) 原子力	295.2	298.1	298.1	298.2	298.4	298.4	298.4	298.4	298.4
		(J) 一般水力	23.3	30.5	29.9	22.1	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
		(K) 地熱	16.7	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
		(H) バイオマス専焼電源	33.0	40.6	38.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3
		(I) 地域資源バイオマス	28.0	28.0	29.0	27.6	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1
		(E-1) 太陽光	964.7	1,034.6	699.8	1,056.7	916.6	916.6	916.6	916.6	916.6
		風力	7.3	10.5	12.5	9.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		(E-2) 想定誤差量	32.0	19.0	234.0	19.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
		エリア供給力 計①	1,537.4	1,610.5	1,484.1	1,579.5	1,455.0	1,455.0	1,455.0	1,455.0	1,455.0
	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	875.0	855.0	865.0	804.3	725.0	725.0	725.0	725.0	725.0
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 201.0	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1	▲ 227.1
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 142.6	▲ 142.6	▲ 172.1	▲ 135.9	▲ 135.9	▲ 135.9	▲ 135.9	▲ 135.9	▲ 135.9
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	0.0	0.0	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		エリア需要等 計⑦=②- (③+④+⑤+⑥)	1,223.1	1,229.2	1,234.3	1,171.8	1,092.5	1,092.5	1,092.5	1,092.5	1,092.5
	必要性 (万kW)	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】
		エリア供給力 計①	1,537.4	1,610.5	1,484.1	1,579.5	1,455.0	1,455.0	1,455.0	1,455.0	1,455.0
		エリア需要等 計⑦	1,223.1	1,229.2	1,234.3	1,171.8	1,092.5	1,092.5	1,092.5	1,092.5	1,092.5
		(D) 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧=(①-⑦)	314.3	381.3	249.8	407.7	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5

○需給状況イメージ図

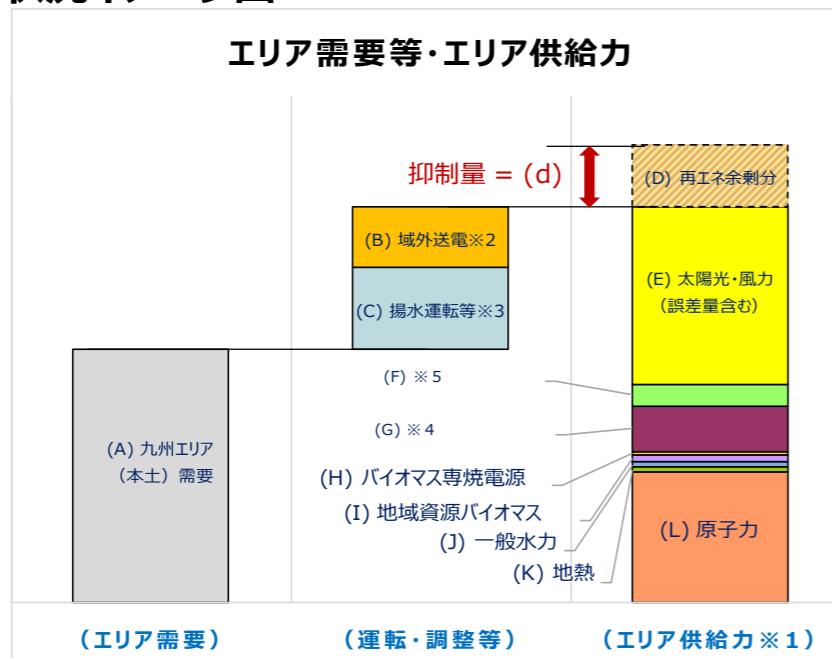

※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
 ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
 ※ 3 : 蓄電設備の充電。
 ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
 ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等


○必要性のイメージ図

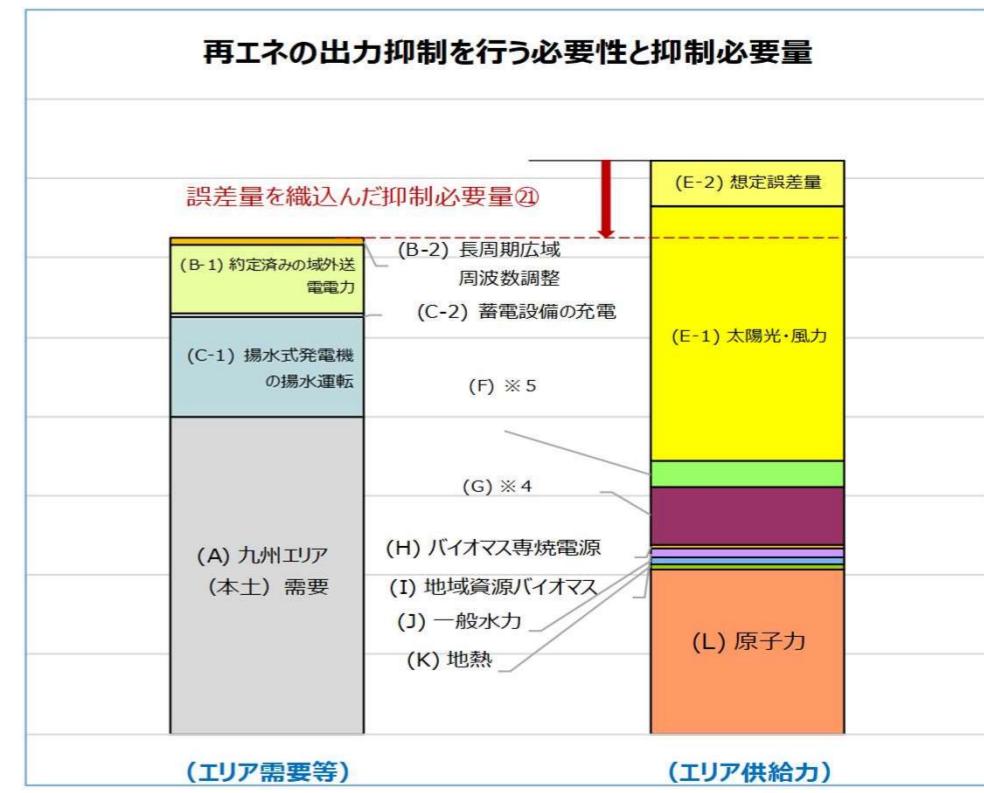

日別の需給状況・再エネ出力抑制の必要性 (2025年4月)


場所		九州本土		九州本土	
出力抑制指令計画時の下限調整力最小時刻 (※)		4月29日(火) 12時30分～13時	4月30日(水) 12時30分～13時	【前日計画】	【当日見直し】
需給状況 (万kW)	エリア 供給力	(F) 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等 (火力)	74.1	74.9	
		(G) 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 (火力)	18.8	19.7	
		(L) 原子力	298.3	298.2	
		(J) 一般水力	27.4	27.5	
		(K) 地熱	16.7	16.7	
		(H) バイオマス専焼電源	38.7	41.3	
		(I) 地域資源バイオマス	28.8	29.3	
		(E-1) 太陽光	1,053.2	919.4	当日見直しがあれば記載
		風力	9.2	9.5	当日見直しがあれば記載
		(E-2) 想定誤差量	19.0	32.0	
		エリア供給力 計①	1,584.2	1,468.5	
必要性 (万kW)	エリア 需要等	(A) エリア需要 (本土) ②	785.0	825.4	
		揚水 (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③	▲ 227.1	▲ 227.1	
		運転等 (C-2) 電力貯蔵装置の充電④	▲ 4.5	▲ 4.5	
		域外 (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤	▲ 135.9	▲ 135.9	
		送電 (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥	0.0	0.0	
		エリア需要等 計⑦ = ② - (③ + ④ + ⑤ + ⑥)	1,152.5	1,192.9	
【前日計画】		【当日見直し】	【前日計画】	【当日見直し】	
(D)	エリア供給力 計①	1,584.2	1,468.5		
	エリア需要等 計⑦	1,152.5	1,192.9		
	誤差量を織込んだ抑制必要量⑧ = (① - ⑦)	431.7	275.6		

○需給状況イメージ図

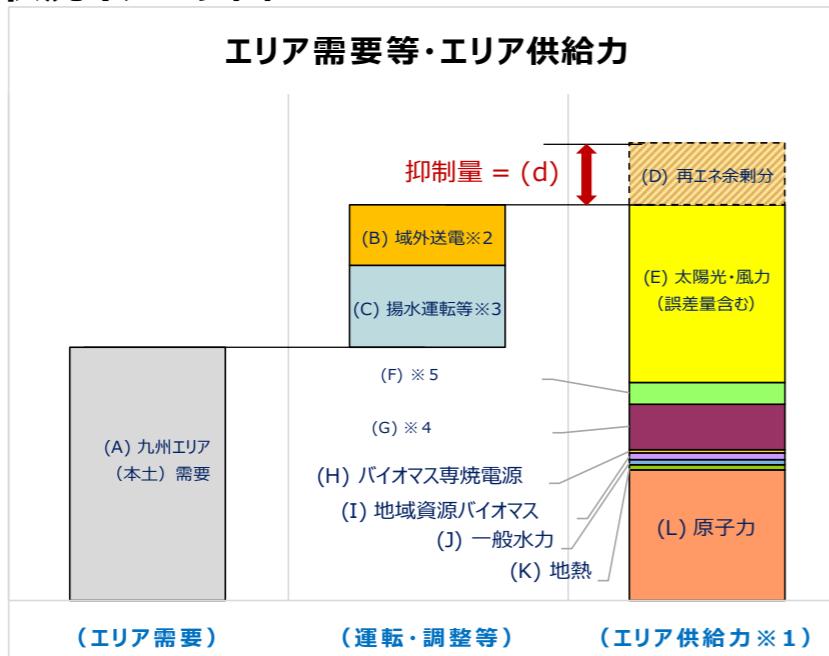

- ※ 1 : 優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
- ※ 2 : 中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
- ※ 3 : 蓄電設備の充電。
- ※ 4 : 調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
- ※ 5 : 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

○必要性のイメージ図

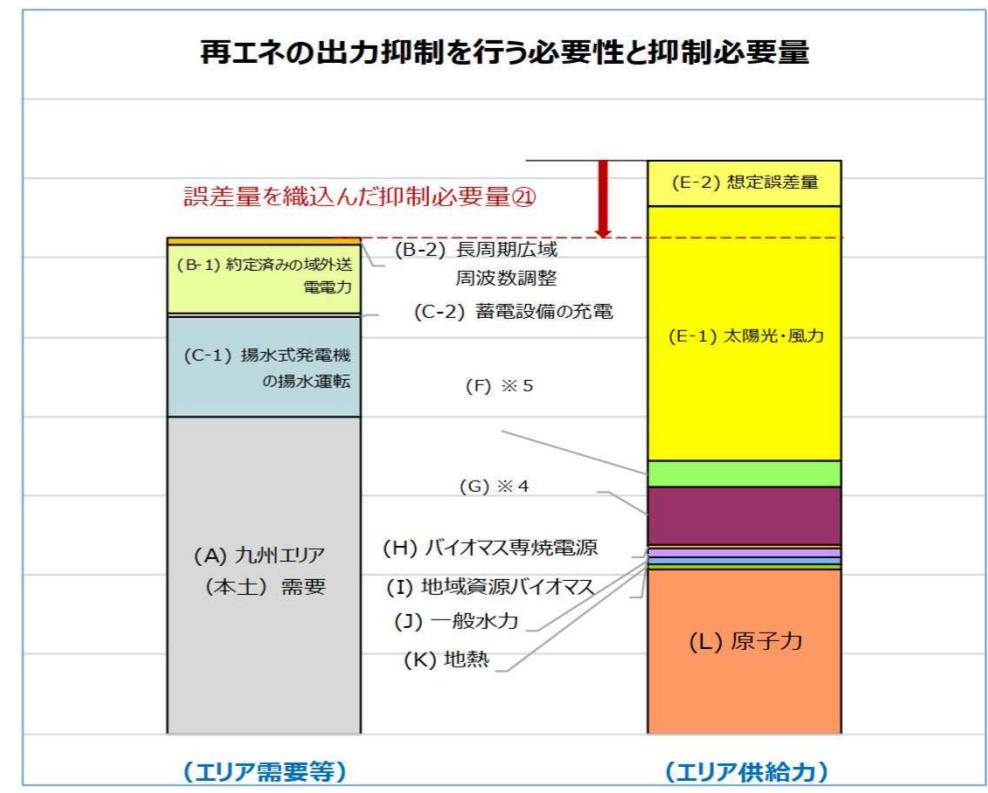

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年4月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				4月2日(水)				4月3日(木)				4月4日(金)				4月5日(土)				4月6日(日)					
調整力として	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)			
あらかじめ確保する発電設備等 (火力)	石炭	松浦	28.1	28.1	0.0		28.1	28.1	0.0		28.1	28.1	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0				
		芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0				
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
		新大分(コンバインド)	55.5	55.5	0.0		55.3	55.3	0.0		55.1	55.1	0.0		53.5	53.5	0.0		51.9	51.9	0.0				
2%確保の発電	合計		92.4	92.4	0.0	—	92.2	92.2	0.0	—	92.0	92.0	0.0	—	74.7	74.7	0.0	—	73.1	73.1	0.0	—			
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																									
発電所		号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)			
揚水発電機の揚水運転	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)			
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0				
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	0.0	32.5	(c)	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0				
		2	▲ 32.5	0.0	32.5	(c)	▲ 32.5	0.0	32.5	(c)	▲ 32.5	0.0	32.5	(c)	▲ 32.5	0.0	32.5	(c)	▲ 32.5	0.0	32.5	(c)			
小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0				
	3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0				
合計		▲ 253.2	▲ 194.6	58.6	—	▲ 253.2	▲ 194.6	58.6	—	▲ 253.2	▲ 162.1	91.1	—	▲ 253.2	▲ 194.6	58.6	—	▲ 253.2	▲ 194.6	58.6	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																									
電力貯蔵装置の充電		豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)			
▲ 5.0		▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																									
調整力としてあらかじめ確保している発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)			
			[出力率%]				[出力率%]				[出力率%]				[出力率%]				[出力率%]						
	電制電源	A	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
		B	54.4	64.1	9.7	(c)	54.4	121.7	67.3	(c)	54.4	121.7	67.3	(c)	27.2	26.1	▲ 1.1	(f)	27.2	26.1	▲ 1.1	(f)			
	電制電源を除く	火力他	21.6	30.1	8.5	(b)	21.6	33.6	12.0	(b)	21.6	47.6	26.0	(b)	21.6	21.7	0.1	(b)	21.6	13.2	▲ 8.4	(b)			
		自家発余剰	10.0	1.8	▲ 8.2	(d)	10.0	1.9	▲ 8.1	(d)	10.0	1.9	▲ 8.1	(d)	10.0	1.7	▲ 8.3	(d)	10.0	1.7	▲ 8.3	(d)			
合計		86.0	96.0	10.0		86.0	157.2	71.2		86.0	171.2	85.2		58.8	49.5	▲ 9.3		58.8	41.0	▲ 17.8					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																									
長周期広域周波数調整 (連系線活用)		中国九州間連系線(関門連系線)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	当時点の空容量①※1 (運用容量)	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)			
※1 空容量 = (運用容量) -約定期外送電力 -三次調整力①②		0.0 (220.6)	0.0	0.0			0.0 (226.0)	0.0	0.0		0.0 (226.0)	0.0	0.0		29.1 (153.3)	29.1	0.0		0.0 (153.0)	0.0	0.0				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																									

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年4月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				4月7日(月)				4月8日(火)				4月9日(水)				4月11日(金)				4月13日(日)							
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
石炭 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0						
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0						
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
	LNG	新大分(コンバインド)	54.3	54.3	0.0		54.7	54.7	0.0		54.5	54.5	0.0		54.5	54.5	0.0		51.7	51.7	0.0						
合計			75.5	75.5	0.0	—	75.9	75.9	0.0	—	75.7	75.7	0.0	—	75.7	75.7	0.0	—	72.9	72.9	0.0	—					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																											
揚水発電機の 揚水運転		発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
揚水発電機の 揚水運転	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1		(c)	▲ 26.1	0.0	26.1		(c)	▲ 26.1	0.0	26.1		(c)	▲ 26.1	0.0	26.1		(c)	▲ 26.1	0.0	26.1		
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		
	小丸川	1	▲ 34.0	0.0	34.0		(c)	▲ 34.0	0.0	34.0		(c)	▲ 34.0	0.0	34.0		(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	0.0	34.0		(c)	▲ 34.0	0.0	34.0		(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		
合計			▲ 253.2	▲ 193.1	60.1	—	▲ 253.2	▲ 193.1	60.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 193.1	60.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—					
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																											
電力貯蔵装置の充電		豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
合計			▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																											
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力) 電制電源を除く	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0																						
		B	27.2 [29%]	26.1	▲ 1.1	(f)	27.2 [29%]	26.1	▲ 1.1	(f)	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0						
	電制電源を除く	火力他	21.6 [18%]	32.2 [27%]	10.6	(b)	21.6 [18%]	31.8 [27%]	10.2	(b)	21.6 [18%]	41.5 [35%]	19.9	(b)	21.6 [18%]	41.5 [35%]	19.9	(b)	21.6 [18%]	19.2 [16%]	▲ 2.4	(f)					
		自家発余剰	10.0	1.7	▲ 8.3	(d)	10.0	1.9	▲ 8.1	(d)	10.0	1.8	▲ 8.2	(d)	10.0	1.8	▲ 8.2	(d)	10.0	1.8	▲ 8.2	(d)					
合計			58.8	60.0	1.2		58.8	59.8	1.0		58.8	70.5	11.7		58.8	70.5	11.7		58.8	48.2	▲ 10.6						
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																											
長周期広域周波数調整 (連系線活用)		中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	当日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)					
合計			0.0 (141.5)	0.0	0.0		0.0 (141.5)	0.0	0.0																		

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年4月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				4月15日(火)				4月16日(水)				4月17日(木)				4月18日(金)				4月19日(土)				
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
石炭 (火力)	松浦	12.4	12.4	0.0			12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0			
	芦北	8.8	8.8	0.0			8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0			
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	新大分(コンバインド)	55.1	55.1	0.0			54.1	54.1	0.0		54.5	54.5	0.0		54.9	54.9	0.0		52.7	52.7	0.0			
合計				108.9	108.9	0.0	—	75.3	75.3	0.0	—	75.7	75.7	0.0	—	76.1	76.1	0.0	—	73.9	73.9	0.0	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																								
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)		
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0			
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0			
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	0.0	34.0	(c)	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0			
合計				▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 159.1	94.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																								
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所		充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
			▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																								
調整力としてあらかじめ確保している 発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)		
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0			
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0			
	電制電源を除く	火力他	21.6 [18%]	33.0	11.4	(f)	21.6 [18%]	43.7	22.1	(f)	21.6 [18%]	30.2	8.6	(b)	21.6 [18%]	35.2	13.6	(b)	21.6 [18%]	23.0	1.4	(b)		
		自家発余剰	(43.6) [24%]				(43.6) [24%]				(43.6) [24%]				(43.6) [24%]				(43.6) [24%]					
合計				129.8	137.0	7.2		58.8	71.4	12.6		58.8	57.9	▲ 0.9		58.8	62.9	4.1		58.8	50.7	▲ 8.1		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																								
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)			前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
				0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (123.0)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																								
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)																

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況 (2025年4月)

[万kW]

優先給電ルールに基づく抑制、調整 (1)				4月21日(月)				4月24日(木)				4月25日(金)				4月26日(土)				4月27日(日)						
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0					
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0					
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					
	LFC	新大分(コンバインド)	54.7	54.7	0.0		54.3	54.3	0.0		54.5	54.5	0.0		53.3	53.3	0.0		51.7	51.7	0.0					
	合計		108.9	108.9	0.0	—	75.5	75.5	0.0	—	75.7	75.7	0.0	—	74.5	74.5	0.0	—	72.9	72.9	0.0	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (2)																										
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)				
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)				
		2	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0					
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0					
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0					
	合計		▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—				
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (3)																										
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (4)																										
調整力としてあらかじめ確保している ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0																	
		B	27.2 [29%]	27.2	0.0		27.2 [29%]	27.2	0.0																	
	電制電源を除く	火力他	21.6 [18%]	33.6 [29%]	12.0	(f)	16.0 [15%]	29.4 [28%]	13.4	(f)	23.9 [20%]	22.4 [18%]	▲ 1.5	(f)	23.9 [20%]	20.2 [17%]	▲ 3.7	(b)	23.9 [20%]	30.3 [26%]	6.4	(b)	23.9 [20%]	30.3 [26%]	6.4	(b)
		自家発余剰	10.0	0.5	▲ 8.8	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.5	▲ 9.5	(d)	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)	10.0	2.0	▲ 8.0	(d)	10.0	2.0	▲ 8.0	(d)
	合計		129.8	137.0	7.2		53.2	57.1	3.9		61.1	50.1	▲ 11.0		33.9	20.4	▲ 13.5		33.9	32.3	▲ 1.6		33.9	32.3	▲ 1.6	
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (5)																										
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異 (②-①)	差異理由(※)	
		0.0 (142.6)	0.0	0.0		0.0 (142.6)	0.0	0.0		27.2 (172.1)	0.0	▲ 27.2	(a)	0.0 (135.9)	0.0	0.0		0.0 (135.9)	0.0	0.0		0.0 (135.9)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整 (6)																										

日別の優先給電ルールに基づく抑制、調整状況（2025年4月）

[万kW]										
優先給電ルールに基づく抑制、調整（1）	4月29日(火)			4月30日(水)						
調整力として あらかじめ確保 する発電設備等 (火力) LFC調整力 2%確保の発電	燃料	発電所	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
石炭 LNG 新大分（コンバインド） 2%確保の発電	石炭	松浦	12.4	12.4	0.0		12.4	12.4	0.0	
	石炭	芦北	8.8	8.8	0.0		8.8	8.8	0.0	
	LNG	新小倉	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	LFC調整力 2%確保の発電	新大分（コンバインド）	52.9	52.9	0.0		53.7	53.7	0.0	
合計			74.1	74.1	0.0	—	74.9	74.9	0.0	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整（2）										
揚水発電機の 揚水運転	発電所	号機	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	揚水動力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
	大平	1	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)	▲ 26.1	0.0	26.1	(c)
		2	▲ 26.1	▲ 26.1	0.0		▲ 26.1	▲ 26.1	0.0	
	天山	1	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
		2	▲ 32.5	▲ 32.5	0.0		▲ 32.5	▲ 32.5	0.0	
	小丸川	1	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		2	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		3	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
		4	▲ 34.0	▲ 34.0	0.0		▲ 34.0	▲ 34.0	0.0	
合計			▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—	▲ 253.2	▲ 227.1	26.1	—
優先給電ルールに基づく抑制、調整（3）										
電力貯蔵装置の充電	豊前蓄電池変電所	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	充電最大電力①	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	▲ 5.0	▲ 4.5	0.5	(e)	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（4）										
調整力としてあら かじめ確保してい ない発電設備等 (火力)	種別	発電所	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)
	電制電源	A	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0	
		B	0.0 [0%]	0.0	0.0		0.0 [0%]	0.0	0.0	
	電制電源 を除く	火力他	23.9 [20%]	18.5 [15%]	▲ 5.4	(b)	23.9 [20%]	19.5 [16%]	▲ 4.4	(b)
		発電設備の補修停止等を考 慮した抑制日の最低出力 () 内は、全設備運転時	(43.6) [24%]				(43.6) [24%]			
		自家発余剰	10.0	0.3	▲ 9.7	(d)	10.0	0.2	▲ 9.8	(d)
		合計	33.9	18.8	▲ 15.1		33.9	19.7	▲ 14.2	
優先給電ルールに基づく抑制、調整（5）										
長周期広域周波数調整 (連系線活用)	中国九州間連系線 (関門連系線)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	前日12時時点 の空容量①※1 (運用容量)	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		0.0 (135.9)	0.0	0.0		0.0 (135.9)	0.0	0.0		
優先給電ルールに基づく抑制、調整（6）										
バイオマス専焼電源	電源合計	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	合意した最低 出力①※2 [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	差異理由(※)	
		※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力	36.3 [59%]	38.5	2.2	(c)	38.5 [58%]	41.2	2.7	(c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（7）										
地域資源バイオマス	電源合計	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	合意した 最低出力① [出力率%]	前日計画②	差異（②-①）	理由A～C毎 (発電所数)	
	出力抑制可	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	
	出力抑制不可	—[0%]	28.8	—	A(61),B(33),C(4)	—[0%]	29.3	—	A(61),B(33),C(4)	

地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）

(※)差異理由 (a)連系線運用容量の維持・他供給区域の制約
(b)燃料貯蔵関係の出力変更

(c)試運転・作業に伴う出力変更・停止
(d)自家発設備など工場の生産調整に基づく計画
(e)設備トラブルに伴う出力変更・停止
(f)その他
