


1 取替え範囲

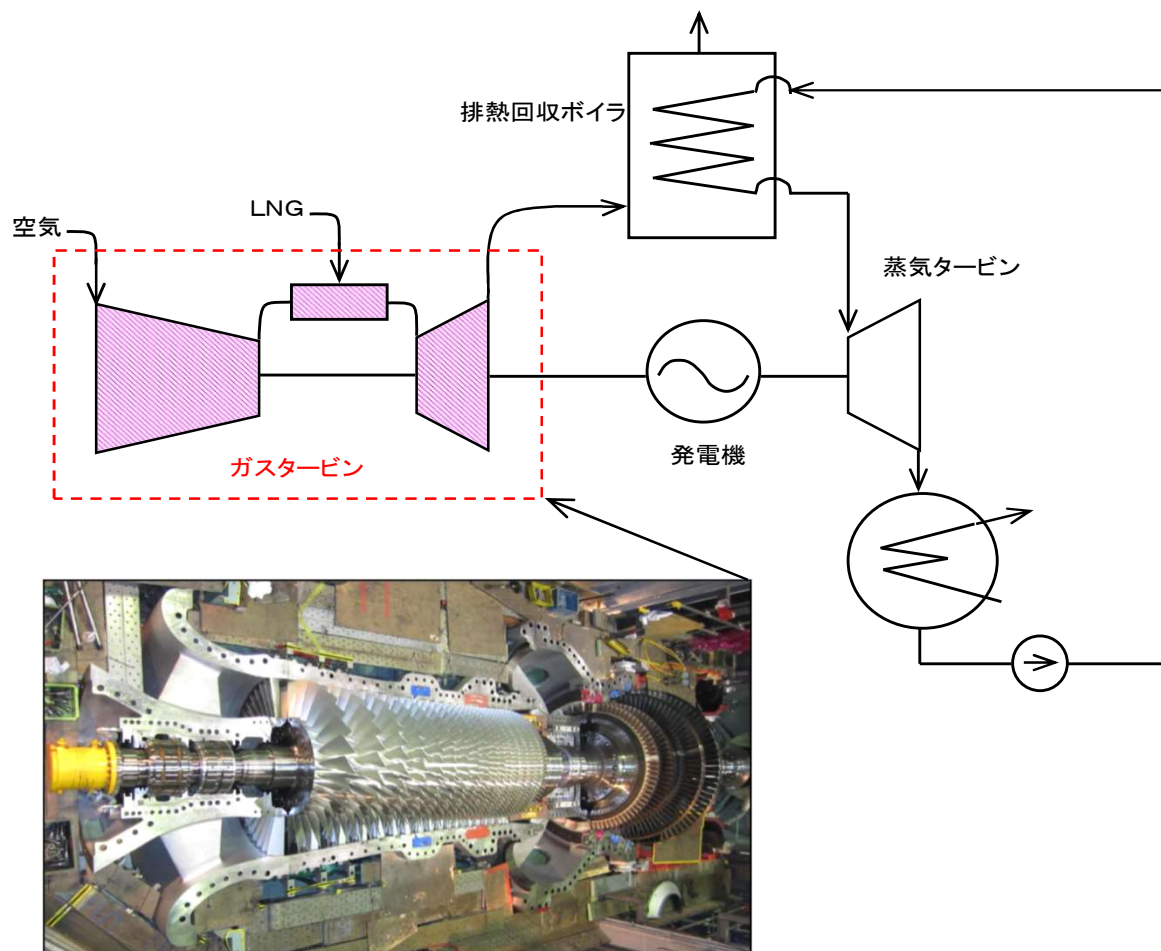

2 更新工事(実績)

H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)
第4軸	第2軸	第6軸	第5軸	1軸あたりの工事日数: 約190日	
			東日本大震災以降、供給力確保の為、一時工事中断	第1軸	第3軸

〔新大分発電所の概要〕

- ・所在地 大分県大分市大字青崎4番1
- ・発電方式 複合発電方式 (コンバインドサイクル)
- ・燃料 LNG (液化天然ガス)
- ・総出力 280.44万kW

	1号系列 (第1～6軸)	2号系列 (第1～4軸)	3号系列 (第1～4軸)
出力	69万kW	92万kW	119.44万kW
運転開始	平成3年6月	第1、2軸: 平成6年2月 第3、4軸: 平成7年2月	第1～3軸: 平成10年7月 第4軸: 平成28年6月
