

川内原子力発電所 2 号機 第27回定期検査の概要

1. 関係法令

原子炉等規制法 第43条の 3 の16 第 1 項 (定期事業者検査)

2. 定期事業者検査を実施した設備

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 原子炉冷却系統施設
- (4) 計測制御系統施設
- (5) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (6) 放射線管理施設
- (7) 原子炉格納施設
- (8) その他発電用原子炉の附属施設
 - ①非常用電源設備
 - ②常用電源設備
 - ③火災防護設備

3. 定期検査期間中に実施した主な工事

(1) 燃料の取替え

燃料集合体157体のうち、40体を新燃料に取り替えた。

(2) 受電系統の変更に係る工事

外部電源確保の更なる信頼性向上を図るため、発電所外から受電する回線数を 3 回線から 6 回線に増強 (2023年12月増強済) するとともに、特高開閉所を高台に移設する工事を実施してきた。今回の定期検査において、2 号機の発電機を新たな特高開閉所へ接続したため、高台の特高開閉所から送電を行う。

4. 今後の主な検査予定



総合負荷性能検査 (12月24日、25日)

以 上

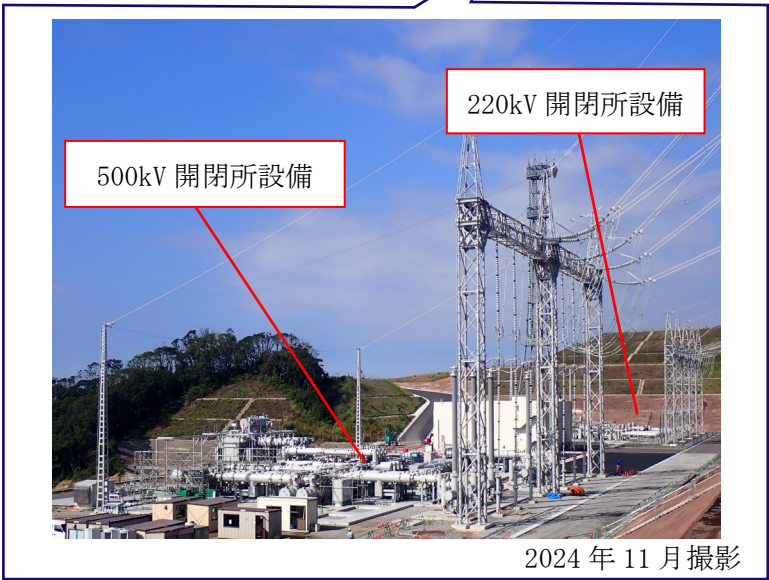
主な工事の概要

受電系統の変更に係る工事

外部電源確保の更なる信頼性向上を図るため、発電所外から受電する回線数を3回線から6回線に増強（2023年12月増強済）するとともに、特高開閉所を高台に移設する工事を実施してきた。今回の定期検査において、2号機の発電機を新たな特高開閉所へ接続したため、高台の特高開閉所から送電を行う。

増強前	現在（増強後）
	
3回線（500kV：2回線、220kV：1回線）	6回線（500kV：2回線、220kV：4回線）

【受電回線数増強 概略図】



【特高開閉所移設 概略図】
